




කඩරට නව ගම්මාන, යටිනල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
මලෙනාට්ටූ ප්‍රතිය කිරාමංක්කൾ, ඉට්කට්ටමෙපු මත්‍රුම සම්ක අපිවිරුත්ති අමේස්ක
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development



කාර්යකාධනය (තුගතිය) 2017 සහ ඉදිරි වැඩකටහන්
2017-සේයලාප්පූකෙ (මුණ්ණේප්පූම) මත්‍රුම එතිර්කාල නිකழ්ස්සිත්තිට්ටන්කள්
Performance (Progress) 2017 and Future Programmes

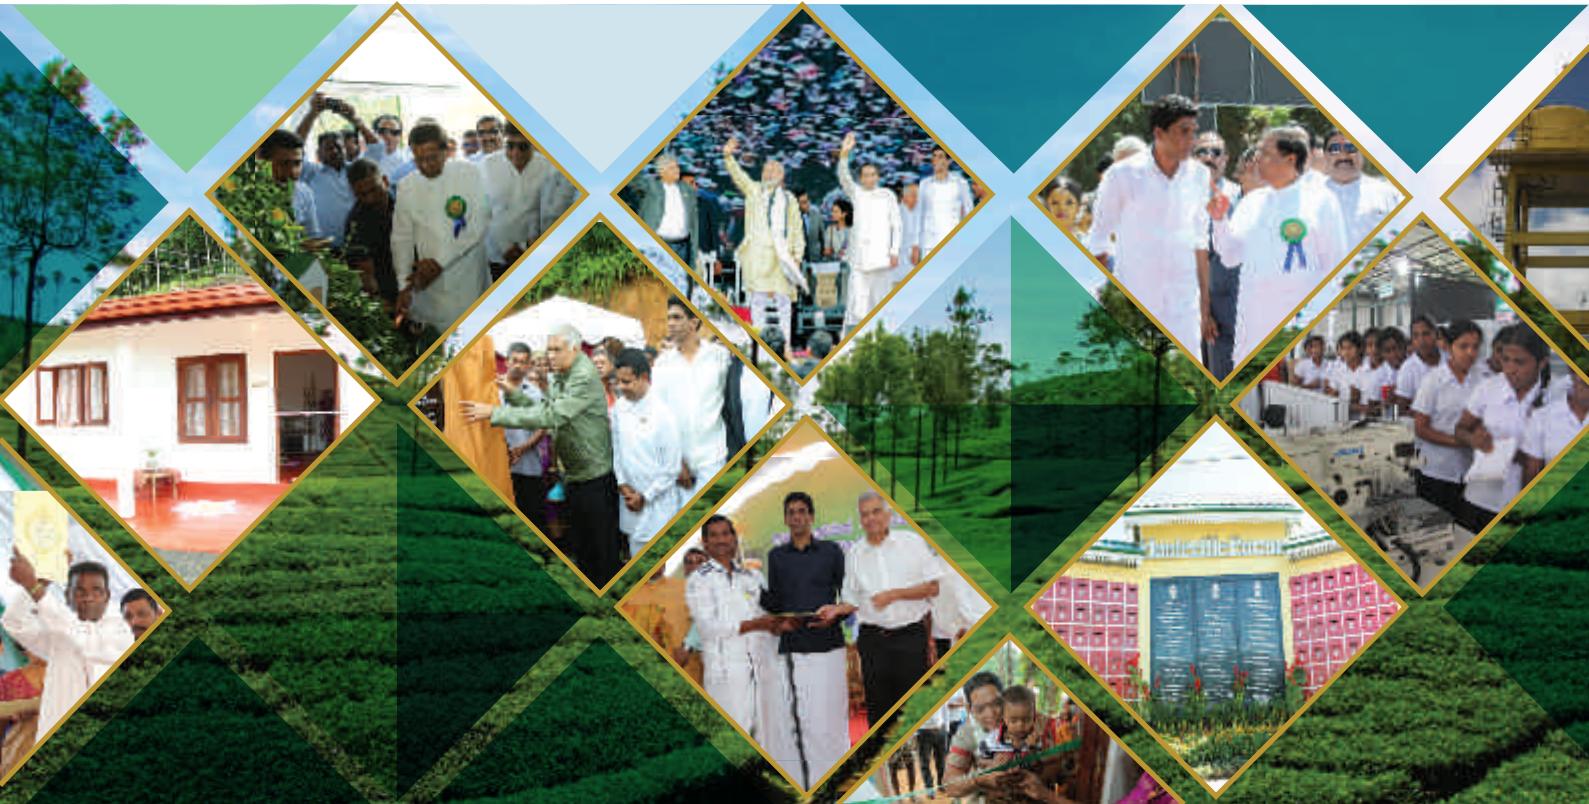

කාර්යසාධනය (ප්‍රගතිය) 2017 සහ ඉදිරි වැඩසටහන්
2017-සේයලාංත්‍රුකෙක (මුණ්ණේංත්‍රම) මත්ත්‍රාම නිකම්ස්සිත්තිට්තන්කள්
Performance (Progress) 2017 and Future Programmes

කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
මලෙන්නාට් ප්‍රතිඵලි කිරාමන්කள්, මූල්‍ය මෘදුකාංග ආයතන අමාත්‍යාංශය
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development

කාර්යසාධනය (ප්‍රගතිය) 2017 සහ
ඉදිරි වැඩසටහන්

2017 - ජේයලාංපුරුකෙක (මුණ්ණෝධ්‍රාම) මත්තුම්
ඝනීර්කාල නිකුත්ස්ථිට්‍තාන්කන්

**Performance (Progress) 2017 and
Future Programmes**

කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
මෘලෙනාත්‍රූ ප්‍රතිය කිරාමන්කන්, ඉට්කට්ටමෙපු මත්තුම් සුමුක ආධිකරුත්ති අමෙස්ස
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development

P.O. Box 562, No. 45, St. Michale's Road, Colombo 03.
Tel: 0112 541 369 Fax : 0112 328 117
Email : smpid@slt.net.lk / mhplanning2016@gmail.com
Web site www.mhnv.gov.lk

Printed with VOC free, non toxic vegetable oil-based environmentally-friendly ink, on 100% recycled paper
using wood free pulp which is made from 100% post consumer waste paper
(*Paper recycling is the process of recovering waste paper and remaking it into new paper products.*)

Recycling one ton of paper saves
17 mature trees, 26 m³ of water, 2.3 m³ of disposal space, 320 liters of oil, and 4,100 kilowatt-hours of electricity.

We encourage you to recycle this document after use.

Printed by Printec Establishment (Pvt)Ltd - www.printec.lk



කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා
ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කාර්යසාධනය (ප්‍රගතිය) 2017 සහ
ඉදිරි වැඩසටහන්

දැක්ම

වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රජාව,
අන් ජන කොටස් හා සමාන සමාජ තත්ත්වයකින්,
ආත්ම ගෞරවයකින් හා අහිමානයකින් හෙබි
ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් ලෙස පරිණාමනය කිරීම

මෙහෙවර

වැවිලි අංශයේ ජනතාවගේ සුහසාධනය,
මුළුන්ගේ වාසස්ථාන,
ඡ්‍රීවන තත්ත්වය
හා
සමාජ ආර්ථික පහසුකම්
වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම



පුරුණ

01. හැඳින්වීම
02. අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කිරීම
03. අමාත්‍යාංශයේ සංවිධාන ව්‍යුහය හා තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය
04. අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ප්‍රවේශය හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය
 - 4.1. සංවර්ධන ප්‍රවේශය සහ ප්‍රමුඛතා
 - 4.2. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය හා ආයතනික ව්‍යුහය
05. 2017 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය
06. සංවර්ධන වැඩසටහන් හා ප්‍රගතිය
 - 6.1. කුදාරට නව ගම්මාන සඳහා තිබාස
 - 6.2. පසුගාමී ප්‍රදේශ වල සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය
 - 6.3. ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාග්ධනය
07. අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 වසරේ අත්පත් කර ගන්නා ලද විශේෂ ජයග්‍රහණ
08. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන
 - 8.1. වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය
 - 8.2. ප්‍රජාගක්ති මෙහෙයුම් ඒකකය
09. අමාත්‍යාංශයේ අප්‍රේක්ෂා හා 2018 ආයෝජනය
10. අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් - ජායාරූප



කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා
ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
ගරු පලනි දිගාම්බරම මැතිතුමාගේ පණිවුඩය

ක්‍රිස් දුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කිරීමත් සමගම එතෙක් ලයින් කාමර වාසස්ථානය කර ගත් ප්‍රජාව තමන්ට අයත් වූ තනි නිවසක් හා නිරවුල් ඉඩමක අයිතිය උරුමකරගත් අම්මානවත් ප්‍රුරවැසියන් බවට පත් කිරීමේ කාර්යාලය ක්‍රියාවට තැබූ අතර එය, ආර්ථික, සමාජයේ හා දේශපාලනික වශයෙන් වැවිලි ප්‍රජාව එතෙක් අත්තින්දා වූ පුද්කලා බව බිඳ දැමීමේ ආරම්භ විය.

6

නව ගම්මාන සංකල්පය යටතේ වැවිලි ප්‍රජාව වෙත නිවාස ලබා දීම මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරුණු ප්‍රජාන කර්තව්‍යයක් වන අතර නුවරඑළිය ආගරපතන වැවිලි සමාගමට අයත් “හුව්විල්” වතුයායේ ඉදි කරන ලද නව නිවාස ගම්මානය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 පෙබරවාරි මස ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. එට සමාගම්ව එම නිවාස ප්‍රතිලාභීන් සඳහා නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රදානයද අරඹින ලදී. එය අඛන්ඩව ක්‍රියාවට තංවමින් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ප්‍රතිලාභීන් 2864 ක් සඳහා නිරවුල් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම 2017 ඔක්තොබර් මස හැටන්හිදී සිදු කරන ලද අතර එය ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

නිවාස වැඩසටහන සැලකිල්ලට ගත් කළ එහි ඉදිකිරීම දේශීය අයවැය ප්‍රතිපාදන මත මෙන්ම ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ ද සිදු කරනු ලැබේ. ඉන්දියානු රජය විසින් මෙතෙක් ලබා දී ඇති නිවාස එකක 4,000 ට අමතරව තවත් නිවාස එකක 10,000 ක් ඉදිරි වසර වලදී ඉදි කිරීම සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දී ඇත.

වැවිලි ප්‍රජාවගේ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා වන පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ප්‍රධාන වශයෙන් රජයේ මුදල් ප්‍රතිපාදන මත ක්‍රියාත්මක වන බැවින් එහි සඳහන් අනෙකුත් සංරච්ඡයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විදේශීය අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ද අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රයත්න දරමින් සවී. රැකියා වෙළඳපොල ඉලක්ක කර ගනිමින් රැකියා විරහිත තරුණෝගන් සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ප්‍රහුණුව ලබා දීමට පූල් බැංක් වෘත්තීය ප්‍රහුණු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර

ඒ සඳහා ඉන්දියානු රජය විසින් රැඡියල් මිලියන 199 ක ආධාර ලබා ඇත. නුපුහුණු රකියාවන් වෙත අවතිරේක වී ඇති උගත් තරුණ පරපුර ඉන් මුදවා වඩාත් වැඩි වැටුප් ඉපයිය හැකි පුහුණු රකියාවන් වෙත යොමු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම අමාත්‍යාංශය මුහුණ පා ඇති විශාලතම අනියෝගයක් වී ඇත.

අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්කර ඇති “නව ගමමාන සංවර්ධන අධිකාරිය” පිහිටුවේම තුළින් ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීමත් නව ගමමාන පිහිටුවේම ක්‍රියාවට නැංවීමත් අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම මේ හරහා දේශීය හා විදේශීය අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමටත් අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාන්විත ධාරිතාව පූජල් කිරීමටත් සැලසුම් කෙරෙන අතර එමගින් සමාජ සංවර්ධන දරුණක හා සැසදීමේදී වඩාත් පිහිටුව හා පූදකලා බවට පත්ව ඇති මෙම වැටුලි ප්‍රජාව, අන් සමාජ කොටස් හා සමාන වරප්‍රසාද ලත් හා ජාතික පරිපාලන පද්ධතියට අනුගත වූ ජනකාටසක් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව උදාවනු ඇත.

පලනී තිගාමිලරම (ප.ම.)

කුදාරට නව ගමමාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය



කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා
ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
ලේකම්තුමියගේ පණීවුඩය

ශ්‍රී ලංකාව වර්ෂ 2025 දී සමෘද්ධීමත් සහ සම්පත්වලින් සහිත දේශයක් බවට පත් කිරීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දුරදරු වැඩිපිළිවෙළකට අවතරණ වී ඇත. මෙම දුරදරු වැඩි පිළිවෙළ හරහා වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජ්වන තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ප්‍රජාවන්ට සමාන වන පරිදි වැඩි දියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඔවුන්ගේ දිරිදාතාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය හා පෝෂණය, නිවාස සහ පිරිසිදු පානිය ජලය සඳහා ඇති අවස්ථා යන ජ්වන දේශකයන් නාගරික මට්ටමේ ජ්වන දේශක සමග සංසන්ධිය කරන විට පහළ අයයක පවතී. මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් වෙන්කරන ලද අරමුදල් හාවිත කරමින් සහසු සංවර්ධන අරමුණු සහ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු අත්පත් කර ගැනීමේ අරමුණින් වැවිලි ප්‍රජාවගේ සාමාන්‍ය ජ්විතය සහ ප්‍රජා සංවර්ධනයෙහි වැඩි දියුණු කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. අප විසින් පසුගිය වර්ෂයේදී සකස් කරන ලද ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුකූලව ප්‍රමුඛතාව හිමි ගැටුපු සහ එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ. තවද, අප විසින් අදාළ සියලු අමාත්‍යාංශ සහ සංවිධාන සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීම තුළින් ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් නියම කර ඇති අරමුණු ප්‍රගතිය ප්‍රාග්ධන සඳහා දැනටමත් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

2017 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස 09 වන දින, අතිරි ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් පළමුවෙන්ම පුවිවිල් යන නව ගම්මානය උත්සවාකාරයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි. එම අවස්ථාවේදී ප්‍රතිලාභීන් 71 දෙනෙකුට නිවාස සම්බන්ධයෙන් නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පු පිරිනැමීම වැවිලි ක්ෂේත්‍ර ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියාවෙනු නොඅනුමානය. එසේම, රජය විසින් වෙන් කරන ලද අරමුදල් මගින් 2010 සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ඉදිකරන ලද සියලු නිවාස සඳහා නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබීම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයකි. සාම්ප්‍රදායික ලයින් කාමර නිවාස බවට පත් කිරීම පමණක් නොව රෝහල් සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම, සෙසු මහා මාර්ග, අධ්‍යාපන

පහසුකම්, සෞඛ්‍යය හා ක්‍රිඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම මෙන්ම පූජත්‍යා ස්ථාන සහ සමුපකාර සම්ති ආදිය ඉදිකිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම හරහා වඩා යහපත් ජ්‍යවන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමද අප අමාත්‍යාංශයෙන් ඉටු කෙරෙන මෙහෙවර තුළ අන්තර්ගත වේ.

වර්ෂ 2017 සැප්තැම්බර මස තෙක් කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වාගෙන යන ලද ව්‍යාපෘති සහ මෙම වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර සම්පූර්ණ කළ යුතු ව්‍යාපෘති මෙම කාර්ය සාධන වාර්තාවෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සඳහා ආදර්ශමත් නායකත්වයක් සහ මාර්ගෝපදේශකත්වයක් සපයනු ලබන සහ ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ වතු ප්‍රජාවට කිසිවකුට නොදෙවනි වන තත්ත්වයක් තහවුරු කිරීම සඳහා වතු ප්‍රජාවගේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය කැඩිනම් කිරීමට ව්‍යාපෘති නිර්මාණය කරනු ලබන ගරු අමාත්‍ය පලනි දිගාම්බරම මැතිතුමා හට මාගේ අවංක ස්තූතිය පුද කිරීමට මම කැමැත්තෙමි. එසේම, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජීවිත තුළ ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාකරනු ලබන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ද මාගේ විශේෂ ස්තූතිය පුදකරමි. එසේම ලබා දෙන ලද සහයෝගය වෙනුවෙන් අනෙකුත් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ටද මාගේ ස්තූතිය පිරිනමම්. තවද, අප අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගෙන්, වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරයේ නිලධාරීන්ගෙන්, පළාත්, දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ නිලධාරීගෙන් අප අමාත්‍යාංශයේ වැඩසටහන් කාර්යක්ෂමව හා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා ලැබෙන සහයෝගය හා ඔවුන්ගේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන් එම සියලු දෙනාටම මාගේ විශේෂ ප්‍රශ්නසාව සහ කාතයුතාව පළ කරනු කැමැත්තෙමි. වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජ්‍යවන තත්ත්වය තාගා සිටුවීමට අප සැම එක්ව ක්‍රියාකරමි.

රංජිති නඩරාජාපිල්ලෙකි

ලේකම්



01

හැඳින්වීම

ඇතවර්ප දෙකකට ආසන්න ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි ප්‍රජාවගේ මූලාරම්භය, මෙරට ඩ්‍රිතාන්තයේ යටත් විෂ්ත යුගයක්ව පැවති සමය දක්වා පැතිර යයි. ඩ්‍රිතාන්තයන් විසින් වර්ප 1840 දී කදුකරයේ කෝපී වගා කිරීම සඳහා, කමිකරුවන් ලෙස දකුණු ඉනදියාවෙන් ගෙන්වා ගනු ලැබූ මෙම ජන කොට්ඨාය, කෝපී වගාව විනාශවීමෙන් අනතුරුව ඇතිකළ තේ හා රඛර වගාවන් කේත්ද කර ගනිමින් සුවිශ්චී තුදකලා ජන කොටසක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත.

ලැයින් කාමර සහිත පේලි නිවාස සිය වාසස්ථාන කොට ගනිමින්, ඉතා දිලිඹ කමිකරු ජ්‍වන රටාවකට හිමිකම් කියන මොවුන්, මානව සංවර්ධන දරුගක (නාගරික හා ග්‍රාමීය) හා සැසදීමේදී, අන් ජන කොටස් වලට සාපේක්ෂව කැඳී පෙනෙන සමාජ විෂමතාවකට ලක්ව ඇති බව පෙනී යයි. සමාජ සංවර්ධන දරුගක හා සසදා බැලීමේදී, ඔවුන්ගේ දරුගකයන් ජාතික මට්ටමේ සමාජ සංවර්ධන දරුගකයනට වඩා පහළ අයයක් ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ජනගහනයෙන් 5% ක් පමණ, වතු ප්‍රජාව නියෝජනය කරනු ලබයි. වැවිලි අංශය ආශ්‍රිතව මිලියන 1.1 පමණවන ජනගහනයක්, සංජුව හා වකුව එම ක්ෂේත්‍රයේ නියැලි සිටින්නේ තමන් සකුව එක් බිම් අගලක හෝ නිත්‍යානුකූල අයිතියක් නොමැතිවය.

වතු ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මූලික දත්ත (කුඩා තේ වතු හැර)

1. ඉඩම් පිළිබඳ විස්තර

- වතු සමාගම් සංඛ්‍යාව - 23
- වතු සංඛ්‍යාව- 453
- මූල්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණය - හෙක්ටයාර් 280,034
 - තේ හෙක්ටයාර් 80,637
 - රඛර හෙක්ටයාර් 45,881
 - පොල් හෙක්ටයාර් 9,482
 - වගා නොකරන ලද බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 117,275

(මූලාශ්‍රය:- Annual Health Return, වැ.මා.සං.කා., 2014)

2. ජනගහන තොරතුරු

- මූල්‍ය ජනගහනය 999,166
- මූල්‍ය පවුල් සංඛ්‍යාව 256,545

දිස්ත්‍රික්කය	නුවරඑළිය	බදුල්ල	මහනුවර	රත්නපුර	ගාල්ල	කැගල්ල	ඡ්‍රැන්ඩ්ල
ජනගහනය	446,458	184,862	128,918	113,037	64,336	59,561	997,166
පවුල් සංඛ්‍යාව	113,745	48,359	33,000	28,998	17,047	15,396	256,545

කාර්යාලය (ප්‍රගතිය) - 2017 සහ ඉදිරි වැවසටහන් _____

3. නිවාස, ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම්

නිවාස - වර්තමාන තත්ත්වය		
සංවර්ධනය කරන ලද නිවාස	35,027	13.6 %
යුගල නිවාස	28,062	
තනි ඒකක නිවාස	73,539	
ද්වත්ව නිවාස	69,613	
තාවකාලික නිවාස	13,814	
මහල් ජේලි නිවාස	1,270	
නිවාස අවශ්‍යතාවය	221,518	86.4%

මූලාශ්‍රය :- Annual Health Return, වැ.මා.සං.හා., 2016

4. සෞඛ්‍ය හා පෝෂණය

ග්‍රාමීය, නාගරික, හා ජාතික මට්ටම් වලට සාපේක්ෂව වයස අවු. 5 ට අඩු වනු අංශයේ ලමයින්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් - වර්තමාන තත්ත්වය	
මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව	256,545
දැනට පහසුකම් ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව	138,257 53.9 %
වැසිකිලි අවශ්‍යතාව පවුල් සංඛ්‍යාව	118,288 46.1 %

ඡල පහසුකම් - වර්තමාන තත්ත්වය	
මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව	256,545
දැනට පහසුකම් ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව	142,765 55.6%
ඡල පහසුකම් අවශ්‍ය පවුල් සංඛ්‍යාව	113,780 44.4%

ජනගහන සෞඛ්‍ය සම්ක්ෂණය - 2016 / 2017				
දිරුකක	වතු අංශය %	ග්‍රාමීය %	නාගරික %	ජාතික %
අවුරුදු 5 ට අඩු ලමයි				
මිටිලව	31.7	17.0	14.7	17.3
අඩු බර	29.7	20.8	16.4	20.5
කෘෂ්ඨලව	13.4	15.6	12.9	15.1

මූලාශ්‍රය :- ජනගහන සෞඛ්‍ය සම්ක්ෂණ වාර්තාව 2016/2017.



02

අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කිරීම

2.1. පසුවේ:

එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශයේ 25 වෙනි වගන්තිය, සිවිල් හා දේශපාලනික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර් ජාතික සම්මුතියේ 17, 23 හා 24 වගන්ති මෙන්ම ආර්ථික, සාමාජික සහ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර් ජාතික සම්මුතියේ 11 (1) වගන්තියට අනුව ආහාර, ඇශ්‍රම්, තිබාස, සෞඛ්‍ය සේවා හා ආරක්ෂාවද, අවශ්‍ය සමාජසේවා ආරක්ෂාවද ඇතිව, තමන්ගේත් තම පවුලේත් සෞඛ්‍යයට හා යහපතට ප්‍රමාණවත් ජීවන තත්ත්වයක් තුක්ති විදීමටත්, තම පාලනයෙන් බැහැර ආපදා හේතුවෙන්, ජීවිකාව දුෂ්කර වූ විට රෝගීමටත්, පුරුණ මනුෂ්‍යයෙකු බිජිවීම සඳහා අවශ්‍ය පොද්ගලිකත්වය, හා පොද්ගලික අවකාශය තුක්ති විදීමටත්, සැම මනුෂ්‍යයෙකුටම හිමිකමක් හා අයිතියක් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවද සිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10,11,13 හා 14 වගන්ති මගින්, මෙම අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමින් සියලු ජන කොටස් වෙත මෙයි සියලුම මූලික සේවාවන් සහ පහසුකම් තුක්ති විදීමේ අයිතිය තහවුරු කරලීමේ හාරදාර වගකීම දෙක ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රියාවට නාවමින් සිටී.

දකුණු ඉන්දියාවෙන් සංක්‍රමණිකයන් ලෙස පැමිණ මධ්‍යම, උග්‍ර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත් හි පුදේශවලට සිමාවෙමින්, පුද්‍යලාව ඔවුන්ටම ආවේනික සමාජ, ආර්ථික සහ සංස්කෘතික කොටසක් ලෙස විකාශය වූ වැවිලි ප්‍රජාව, බ්‍රිතානාය යටත් විෂ්‍ය යුගයේ පටන්ම සිය මූලික අවශ්‍යතාවයන් උදෙසා වතු කළමණාකාරීන්වය මත යැඩීම හේතුවෙන් රජය මගින් සපයනු ලබන මූලික සේවාවන් තුක්ති විදීමේ අවස්ථාව මෙම ප්‍රජාව වෙත හිමිවූයේ ඉතා අල්ප මට්ටමකිනි.

එහි ප්‍රතිඵ්‍ය වී ඇත්තේ ගත වර්ෂ දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආදායමට සුවිශාල දායකත්වයක් සපයනු ලැබූ මෙම ගුම්ක ප්‍රජාවට උක්ත වරප්‍රසාද ලැඟාවීම ප්‍රමාද වීමයි. එබැවින්, රාජ්‍ය හා පොද්ගලික දෙංඡලයන්හි පවතින නීති රාමුවන්ගේ ඇති ඇතැම් නොගැලීම් හේතුවෙන් පොද්ගලික වතු සමාගම් යටතේ ජීවිකාවේ නියැලි සිටින මිශ්‍යනයකට ආසන්න ජන කොටස් වෙත නීසි සේවාවන් සැපයීමේ ඇති දුෂ්කරතා මගහැර, මෙම ප්‍රජාවගේ සමාජ සංවර්ධනය ප්‍රශ්නීත මට්ටමකට නැංවීම සඳහා සුවිශ්චිත වූ යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩිව මතුවිය.

2.2. අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කිරීම

එම අනුව, වැවිලි ප්‍රජාව මෙතෙක් මුහුණ දුන් සමාජ විෂමතාවයන් තුරන්කොට අන් ජන කොටස් හා සමාන සමාජ තත්ත්වයකින්, ආත්ම ගෞරවයකින් හා අනිමානයකින් හෙබි ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් ලෙස පරිණාමනය කිරීමේ අදිවනින්, නව ප්‍රවේශයකින්, නව රජයේ ආරම්භයන් සමඟ 2015.09.25 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 1933/13 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් කදුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පිහිටුවන ලදී.

2.3. ප්‍රධාන කාර්යභාරය

01

රජයේ හා පොදුගලික වැවිලි සමාගමවල සේවය කරන ඉඩම් අනිම් ජේල් නිවාසවල ජ්වත්වන ජනතාව සඳහා නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා නව ගම්මාන / නගර නිර්මාණය කිරීම.

02

වතු අංශයේ ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම සඳහා ජ්වතෝපාය උත්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

03

වැවිලි ප්‍රජාව ආර්ථිකව, සාමාජිකව හා සංස්කෘතිකමය වශයෙන් නොකිවුවීම සඳහා මූලික පහසුකම් ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට පියවර ගැනීම.

04

ග්‍රාමීය වතු අංශයන්හි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.

2.4. කාර්යභාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන


වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය

ප්‍රජා ගක්ති මෙහෙයුම් ඒකකය

- 1 පූල් බැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - හැටන්
- 2 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය - රම්බොඩ්
- 3 නොරුවුඩ් ක්‍රිඩා සංකීර්ණය
- 4 ප්‍රජාගක්ති (ර් - කියෝස්ක්) මධ්‍යස්ථාන

03

3.1 අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ සංවිධාන ව්‍යුහය

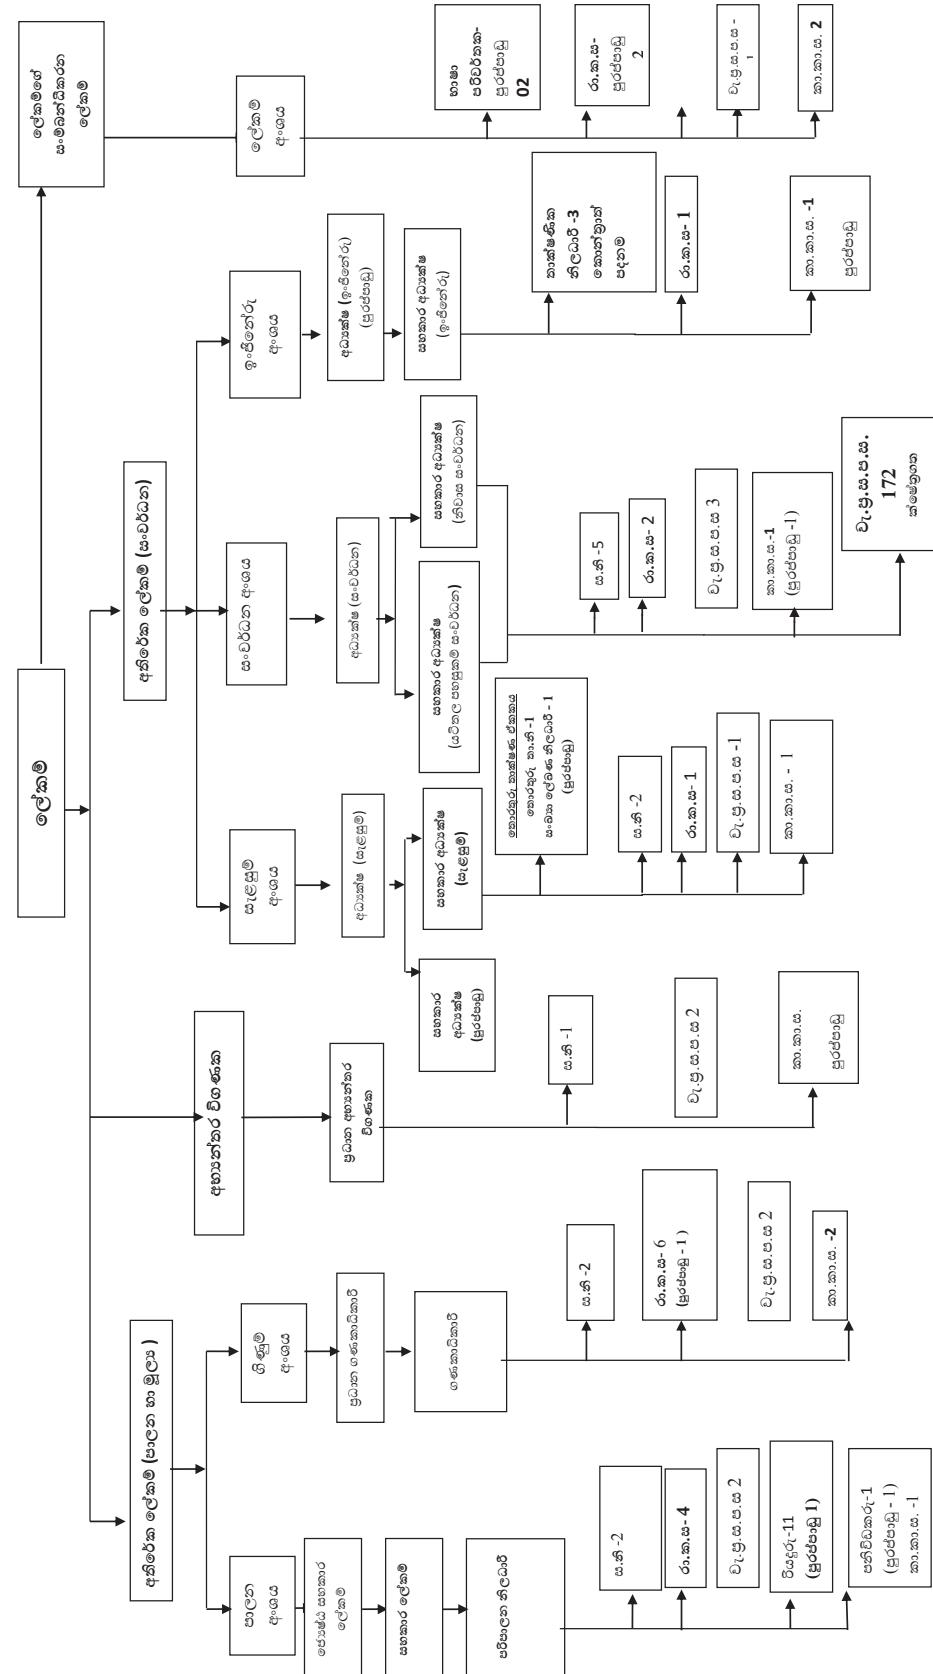

3.2 අමාත්‍යාංශයේ අනුමත හා තත්ත්ව කාර්ය මණ්ඩලය (2017.09.30 දිනට)

ප්‍ර ස් ෂී	තත්ත්ව	සේවය	ගෞනීය/ පංතිය	අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය		තත්ත්ව කාර්ය මණ්ඩලය	
				ජ්‍යෙෂ්ඨ	භාෂාවන්	ජ්‍යෙෂ්ඨ	භාෂාවන්
1.	ලේකම්			1	-	1	-
2.	අතිරේක ලේකම්	ශ්‍රී.ලං.ප.සේවය	විශේෂ	2	-	2	-
3.	ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී.ලං.ප.සේවය	I පන්තිය	1	-	1	-
4.	අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.ප.සේවය	I පන්තිය	1	-	1	-
5.	අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.කු.සේවය	I පන්තිය	1		1	-
6.	අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේවය	I පන්තිය	1	-	-	-
7.	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී.ලං.ග.සේවය	I පන්තිය	1	-	1	-
8.	ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක	ශ්‍රී.ලං.ග.සේවය	I පන්තිය	1	-	1	-
9.	සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී.ලං.ප.සේවය	II/ III පන්තිය	1	-	-	-
10.	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.ප.සේවය	II/ III පන්තිය	2	-	1	-
11.	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.කු.සේවය	II/ III පන්තිය	2	-	2	-
12.	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේවය	II/ III පන්තිය	1	-	1	-
13.	ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී.ලං.ග.සේවය	II/ III පන්තිය	1	-	1	-
14.	පරිපාලන නිලධාරී	රා.කළ.සහ. සේවය	අධි ගේණිය	1	-	1	-
15.	භාෂා පරිවර්තක	භාෂා පරිවර්තක සේවය	II/ II පන්තිය	2	-	-	-
16.	සංඛ්‍යා ලේඛන නිලධාරී			1	-	-	-
17.	තාක්ෂණික නිලධාරී	ශ්‍රී.ලං.තා. සේ	I/ II/ III පන්තිය	3	-	-	2
18.	සංවර්ධන නිලධාරී	සං.නිල.සේ	I/ II/ III පන්තිය	14	-	14	-
19.	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර	ශ්‍රී.ලං.තො.හා. සං.	3 - III/ II/ I	1	-	-	-
20.	ලේකම්ගේ සංම්බන්ධිකරන ලේකම්	තාවකාලික		-	1	-	1
21.	රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර	රා.කළ.සහ. සේවය	I/ II/ III පන්තිය	20	-	12	1
22.	වැවිලි පුජා සන්නිවේදන පහසුකම් සලසන්නා	අමාත්‍යාංශගත		255	-	183	-
23.	නිශ්චල ජායාරූප ගිල්පි	තාවකාලික		0	1	-	1
24.	විඩියෝ කැමරා ගිල්පි	තාවකාලික		0	1	-	1
25.	කැමරා පුද්ගලික සහායක	තාවකාලික		0	1	-	1
26.	රියදුරු	ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය	I/ II/ III විශේෂ	12	-	12	-
27.	කාර්යාල කාර්ය සහායක	කා.සේවක සේවය	I/ II/ III විශේෂ	12	1	7	-
එකතුව				337	5	242	7

3.3 අංශයන් හා කාර්යයන්හාරයන්

ලේකම් අංශය:

අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානීය මෙන්ම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීයා ද වගයෙන් කටයුතු කරන ලේකම්තුමිය යටතේ ලේකම් අංශය ක්‍රියාත්මක වන අතර, එම අංශය වෙත පැවරී ඇති විශේෂ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් අංශ අතර සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගැනීමත්, රස්වීම් සංවිධානය, වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා විදේශීය ආයතන ආදිය සම්බන්ධීකරණයන් මෙම අංශය මගින් මූලික වගයෙන් සිදු කරනු ලබයි.

පාලන අංශය:

වැවිලි මානව ප්‍රජාව සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති ඉලක්ක ගත වකවානු වලට අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සංවිධාන ව්‍යුහය සැකසීම, තව තනතුරු ඇති කිරීම, නිලධාරීන් බදා ගැනීම, පුහුණු කිරීම ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා මෙහෙයුම් පාලන අංශයේ මූලික කාර්යන්හාරය වේ. එයට අමතරව

- අමාත්‍යාංශයේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය
- නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම හා අදාළ අනෙකුත් ආයතනික කටයුතු සිදු කිරීම
- පොදුගලික ලිපි ගොනු පවත්වා ගැනීම
- කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු යාචන්කාලීන කිරීම හා අදාළ ආයතන වෙත බෙදා හැරීම
- වාහන සංවිතය පවත්වාගෙන යාම, වාහන තබන්තුව
- අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය, අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සමග සම්බන්ධීකරණය
- ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි, වතුලේඛ හා වෙනත් අණපනත් අනුව කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙය වීම යනාදී ක්‍රියාදාමයන් පාලන අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 සැප්තැම්බර් දක්වා ලබා දී ඇති පුහුණු වැඩසටහන්

දේශීය

පුහුණු පායමාලාව		ආයතනය	හැඳුරු සංඛ්‍යාව
01	CIGAS	මිලේදා	1
02	Diploma in English	ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය	1
03	Payroll	මිලේදා	1
04	National Diploma in English	ශ්‍රී ලංකා පදනම	1
05	IT Skills for Non IT Officers	මිලේදා	4
06	Occupational Safety & Health Management	එලදායීතා ලේකම් කාර්යාලය	1
07	රජ වාහන හා යන්ත්‍රපූත්‍ර පාලනය	ජාතික ගුම අධ්‍යන ආයතනය	1
08	විද්‍යාත්මක හා පිරිමැසුම්දායක හා ආරක්ෂාකාරී රිය පැදිවීම	ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය	6

09	පෙරාද්ගලික ලිපි ගොනුවක් එලදායීව පවත්වාගන්නේ කෙසේද	ජාතික ගුම අධ්‍යන ආයතනය	3
----	--	------------------------	---

විදේශීය

රට	ප්‍රහුණු පායමාලාව	ආයතනය	හැඳුරු සංඛ්‍යාව
01	විනය	2017 Seminar on Livelyhood & Social Development for Developing Countries	විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
02	විනය	2017 Seminar on Urbanization Construction & Planning for the Belt & Road Countries	විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
03	ඉන්ද්‍යන්සිසියාව	PIM International Programme in Management at Universitas Gadjah Mada	ප්‍රඟ්‍රාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනය
04	මැලේසියාව	Capacity Building Training Programme	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය

සංවර්ධන අංශය:

වැවිලි අංශයේ ජනකාවගේ සූහ සාධනය, ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන, ජ්වලන තත්ත්වය හා සමාජ ආර්ථික පහසුකම් වැළඳු කිරීම උදෙසා අමාත්‍යාංශය, සංරචන 05 ක් යටතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය සභා ඔස්සේ මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීම හා සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳ සියලු වගකීම දරමින් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලින් හා ඉන්දියානු රජයේ සභායායන් යටතේ ලබා දෙන ලද අරමුදල් ද යොදවුමින් අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා ඉක්ක කරා මෙහෙයුමේ කාර්යාලය සංවර්ධන අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි. පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත, ඉහත කර්තව්‍යයන් නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉංජිනේරු අංශයන්ද සුවිගාල ආයතනත්වයක් ලැබේ.

- ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම අධික්ෂණය කිරීම, ක්ෂේත්‍ර වාර්කා පැවත්වීම හා අදාළ ගෙවීම් නිරදේශ කිරීම, මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සැකසීම.
- ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු සැකසීම, ව්‍යාපෘති මාර්ගෝපදේශන සැකසීම හා අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම.
- ප්‍රජාක්ති අධික්ෂණ ඒකකය, ප්‍රජාගක්ති මධ්‍යස්ථාන, පූල් බැන්ක් වෘත්තීය ප්‍රහුණු මධ්‍යස්ථානය, රුම්බොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා තොරුවුම් ක්‍රිඩා සංකීරණය පරිපාලනය.
- පූල් බැන්ක් වෘත්තීය ප්‍රහුණු මධ්‍යස්ථානය නැව්කරණය කිරීම.

සංවර්ධන අංශයේ අධික්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් හා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන:

වැය විෂය අංශය (140-2-4)	වැඩ සටහන	වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන (රු. ම්.)	
		දේශීය	ඉන්දියානු ආධාර
01	1 - 2506	ජ්‍යවත්තා සංවර්ධනය	100
02	2 - 2506	පසුගාමි පුදේශයන්හි සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය	500

03	3 - 2506	වතු නිවාස සංවර්ධනය (කදුරට නව ගම්මාන සඳහා නිවාස ඉදි කිරීම)	2,000	-
04	4 - 2506	ඉන්දියානු රජයේ ආධාර මත හැටෙන් පූල් බැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය	12	120
05	5 - 2506	ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ ඉදිකරනු ලබන නිවාස වැඩසටහන	154	1,134
2,766			1,254	

සැලසුම් අංශය:

අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ප්‍රධාන වශයෙන් පහත කර්තව්‍යන් සැලසුම් අංශය මගින් ඉටු කරයි.

- සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී සහාය ලබාදීම හා අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලස්ම සැකසීම,
- අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ප්‍රාග්ධන ඇස්කමේන්තු සැකසීම
- ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලස්ම ක්‍රියාවත නැංවීම හා එයට අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය
- නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම, ව්‍යාපෘති යෝජනා සැකසීම හා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම
- ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් හා ඇගයීම, ක්ෂේත්‍ර නිරික්ෂණය, ප්‍රගති සමාලෝචනය, ප්‍රගති වාර්තා සැකසීම හා අදාළ ආයතන වෙත යොමු කිරීම
- වෙබ් අඩවිය ප්‍රතිච්චාව වෙත කිරීම
- අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තා සකස් කොට පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
- මෙතෙක් විශාල අඩුපාළුවක්ට පැවැති වැවිලි ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා දත්ත සැකසුම් පද්ධතියක් සැකසීම, දත්ත එක්රස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම

ගිණුම් අංශය:

අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන සඳහා අවකාෂ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මගින් ලබාදීම, වැළැක්වීම හා දීමනා ගෙවීම, සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන්ට අදාළ ගෙවීම් කිරීම, නඩත්තු කටයුතු ආදි රාජු අරමුදල් මගින් සිදු කරනු ගෙවීම සම්බන්ධ සියලු කටයුතුවල වගකීම දරනු ලබන්නේ ගිණුම් අංශය මගිනි.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය:

අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය කටයුතු පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය පිළිබඳව ඇගයීම් සිදු කරමින් අඩුපාළු වැළැක්වීම සහ අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවන්හි විධිමත් බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳව අධ්‍යාපන ඇගයීමකට ලක් කිරීමත්, වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන මත ඉටු කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනාකුම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ප්‍රගතිය තිශ්වය කිරීමට සහායවීමත්, ප්‍රගති සමාලෝචන රස්වීම් වලදී අදාළ කරුණු අනාවරණය කිරීමත්, විගණන අංශය විසින් මූලික වශයෙන් ඉටු කරනු ලබයි.

04

අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ප්‍රවේශය හා ප්‍රමුඛතා

4.1. සංවර්ධන ප්‍රවේශය සහ ප්‍රමුඛතා

වැවිලි ප්‍රජාව මෙතෙක් මූහුණ දුන් සමාජ විෂමතාවයන් තුරන්කොට ඔවුන් අනිමානවත් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් ලෙස පරිණාමනය කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කළ මෙම කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, වැවිලි ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර ගත කරගනිමින් ජ්‍වත් වන පවුල් 2,50,000 ක පමණ (මිලයනයකට අධික ජනගහනයක් ඇති) වතු ජනතාවගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය නිසි දිගානතියක් ඔස්සේ හා මතා අධික්ෂණයකින් යුතුව සිදු කිරීම සඳහා, පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් (2016-2020) සකස් කොට එය ක්‍රියාවට නෘතා ඇත.

එමගින් ප්‍රමුඛතාව ලබා දී ඇති තිවාසි, පානීය ජලය හා සන්නිපාරක්ෂක පහසුකම්, තොළඩා හා පෙළ්ඳෙනෙයි, අධ්‍යාපනය හා මුල් ලමාවිය සංවර්ධනය, වෘත්තීය පුහුණුව හා නිපුණතාවය, ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම යනාදී ක්ෂේත්‍රයන් නියෝගනය කරනු ලබන අනෙකුත් රේඛිය අමාත්‍යාංශ, පළාත් අමාත්‍යාංශ ඇතුළු සියලුම ආයතනයන්හි පූර්ණ දායකත්වය ලබාගතිමින් වැවිලි ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය ගක්තිමත් කිරීම සඳහා, පැවරී ඇති සංවර්ධන කාර්යභාරයන් නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමට මෙම අමාත්‍යාංශය කැපවීමෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.



කතුයාම් තුනදායාත්මක කටුරු ආර්ථික කමෘවර්ගය

- ලේලු නිවාසවල වහල නැවත සෙවිලි තිරෝ ප්‍රතිඵල හා නැවුම් ප්‍රතිඵල සෑපයීම්, සිංහලත්තෙක පහසුකම් සැපයීම් ලතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
- අනෙකුත් යටිකල පහසුකම් සංවර්ධනය, වෙශේ ව්‍යාපෘති

බඳුරට යා ගෝජා
කඩු තිවාක ගුදී මිරෝ

- හරක රන් නිවාස
- ශේෂයානු ආදර සනින නිවාස
- පෙන්වා මූලික නිවාස වැඩිකටුවන

පොදුකාරකය කමෘවර්ගය

- නිපුණතා සංවර්ධනය හා වෘත්තීය ප්‍රතිඵල
ප්‍රතා සැවිබල ගෙන්වීම
සෞඛ්‍ය හා සේෂණය



අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමුඛතා

4.2. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය හා ආයතනික ව්‍යුහය


ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය

අමාත්‍යාංශය මගින් මෙහෙයවනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යභාරය මූලික වශයෙන් අමාත්‍යාංශ විෂය පරිය යටතේ ඇති ආයතනයන් වන වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය, ප්‍රජාගක්ති මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය හරහා ද ර්ට අමතරව දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය සභා මගින් ද සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රයන් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික ව්‍යුහය

ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රය	ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය
(1) කදුරට නව ගම්මාන සඳහා නිවාස ඉදි කිරීම <ul style="list-style-type: none"> (i) හරිත රන් නිවාස (ii) ඉන්දියානු ආධාර සහිත නිවාස (iii) ප්‍රතිලාභී මූලික නිවාස වැඩසටහන 	වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය (PHDT) UNHABITAT, ජාතාන්තර රඛ කුරුස සංවිධානය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, මානව ජනාවාස සංවිධානය, වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සමීකිය හා නිවාස ප්‍රතිලාභීන්
(2) පසුගාමී ප්‍රදේශයන්හි සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය <ul style="list-style-type: none"> (i) ජේලි නිවාසවල වහල තැවත සේවිලි කිරීම (ii) පානීය ජලය සැපයීම (iii) සනීලාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම (iv) ප්‍රමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය (v) අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය (ප්‍රවේශ මාරුග /විදුලිය) (vi) විශේෂ ව්‍යාපෘති (ආගමික / සංස්කෘතික) 	වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය, (PHDT) දිස්ත්‍රික් / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය සභා.
(3) ජ්වනෝපාය සංවර්ධනය <ul style="list-style-type: none"> (i) නිපුණතා සංවර්ධනය හා වෙන්තිය පුහුණුව (ii) ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම (iii) සෞඛ්‍ය හා පෙශීණය 	පුල් බැන්ක් වෙන්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා ප්‍රජාගක්ති සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය, ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල / දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා “වැවිලි ප්‍රජා සන්නිවේදන පහසුකම් සලසන්නා නිලධාරීන්” මගින්

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික ව්‍යුහය

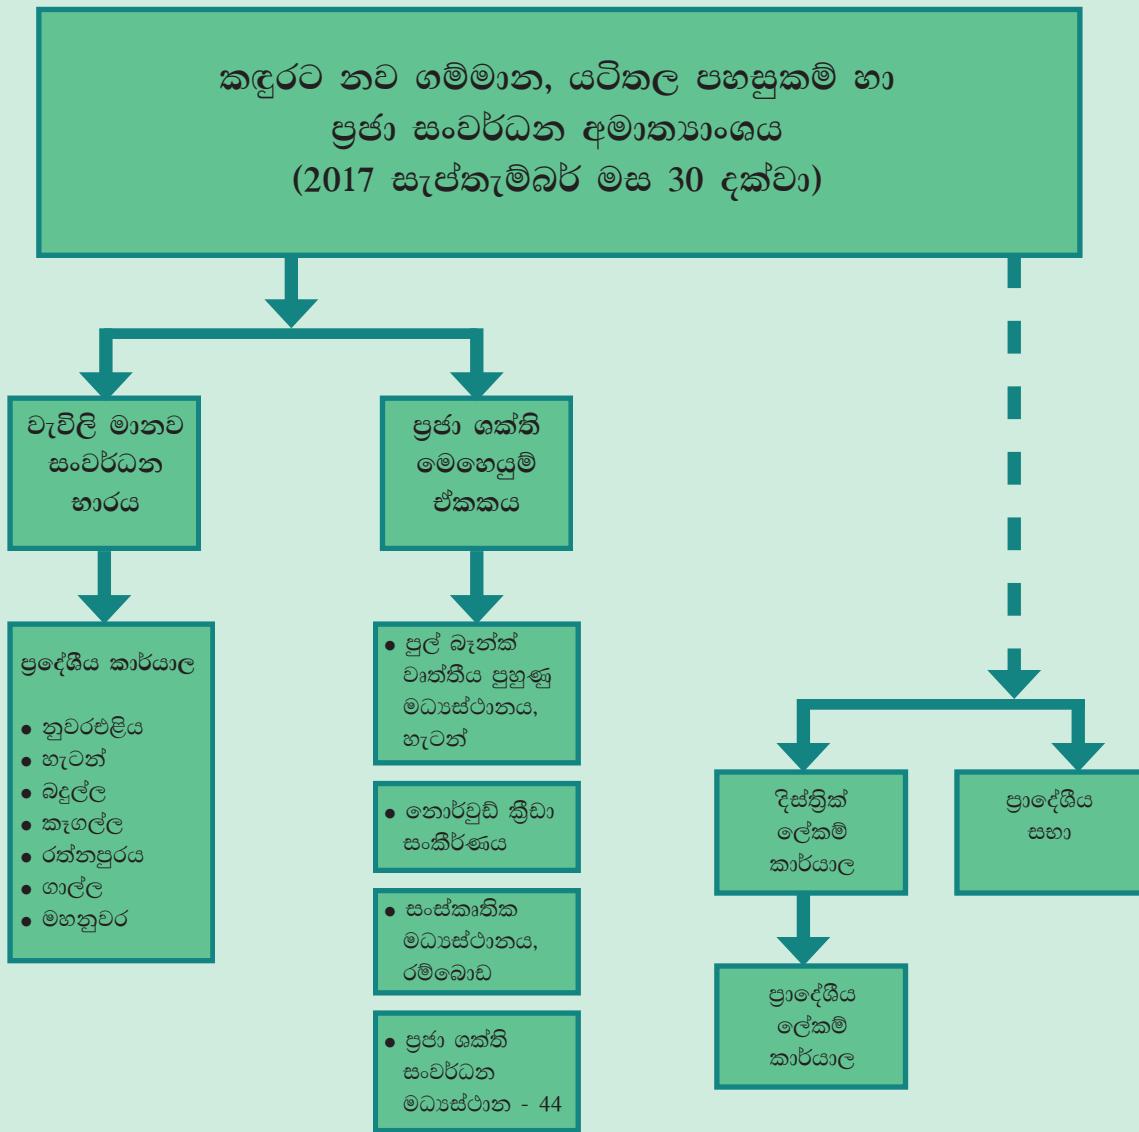

23

05

2017 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

2017 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම

කාණ්ඩය / වැඩසටහන / විෂයය	ප්‍රතිපාදන රු. '000	ප්‍රාග්ධන රු. '000	එකුත්ව රු. '000
අමාත්‍ය කාර්යාලය	24,350	2,500	26,850
අමාත්‍යාංශ පරිපාලනය හා ආයතනික සේවා	311,026	10,010	321,036
ග්‍රාමීය ප්‍රජා සංවර්ධනය			
1. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි ජ්‍වලන්පාය සහ මූලික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම		100,000	100,000
2. පසුගාමී ප්‍රදේශයන්හි සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය		500,000	500,000
3. වතු නිවාස සංවර්ධනය (කදුරට නව ගම්මාන සඳහා නිවාස) (අයවැය යෝජනා ද ඇතුළත්ව)		1,000,000	1,000,000
4. හැටන් පූල් බැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීම (13) (17)		1,000,000	1,000,000
1. ඉන්දීය රජයේ ආධාර මත සිදුකරන නිවාස වැඩසටහන (13) (17)		120,000	120,000
1. ඉන්දීය රජයේ ආධාර මත සිදුකරන නිවාස වැඩසටහන (13) (17)		12,000	12,000
වෙන්කර ඇති මුළු ප්‍රතිපාදන	3,35,376	40,32,510	43,67,886

2017 ජනවාරි - සැප්තැම්බර් 30 දිනට අමාත්‍යාංශයේ වියදුම් සාරාංශය

කාණ්ඩය / වැඩසටහන / විෂයය	2017 සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු: '000)	2017.09.30 දිනට වියදුම් (රු: '000)	වියදුම් ප්‍රතිශතය %
ප්‍රතිච්‍රිත ප්‍රතිපාදන	335,376	223,091	67
ප්‍රදේශල පවතින ආමාත්‍යාංශය	235,350	155,320	66
ගරු ආමාත්‍ය කාර්යාලය	13,050	10,165	78
ආමාත්‍යාංශ පරිපාලනය	222,300	145,155	65
සාමාන්‍ය පරිපාලනය	100,026	67,771	68
ගරු ආමාත්‍ය කාර්යාලය	11,300	6,820	60
ආමාත්‍යාංශ පරිපාලනය	88,726	60,952	69
ප්‍රාග්ධන	4,032,510	781,882	19
සාමාන්‍ය පරිපාලනය	12,510	6,202	50
ගරු ආමාත්‍ය කාර්යාලය	2,500	1,744	70
ආමාත්‍යාංශ පරිපාලනය	10,010	4,458	45
සංවර්ධන වැඩසටහන්	4,020,000 {*(13 - 1,254,000, **17 - 2,766,000)}	839.192	**30.34
අ. ජ්‍වලන්පාය හා මූලික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම	100,000	26.280	26.28
ආ. පහසුගාමී ප්‍රදේශවල සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය	500,000	106.570	21.34
ඇ. කළුරට නව ගම්මාන සඳහා නිවාස	2,000,000	699.90	35.0
ඇ. ප්‍රජාගක්ති වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීම	*13 - 120,000 **17 - 12,000		-
ඉ. ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ ඉදිකරනු ලබන නිවාස වැඩ සටහන	*13 - 1,134,000 **17 - 154,000	6,442	4.18





06

සංවර්ධන වැඩසටහන් හා ප්‍රගතිය

6.1. කළුරට තව ගම්මාන සඳහා නිවාස

වාසස්ථාන සම්බන්ධයෙන් වන දරුකක සැලකීමේදී ද වඩාත් පසුබැමකට ලක්ව ඇති ජන කොට්ඨාය ලෙස වැවිලි ප්‍රජාව සැලකිය හැක. වැවිලි ප්‍රජාව ජ්වත් වන නිවාස වලින් 58% කට අධික ප්‍රමාණයක් පේළි නිවාස වන අතර එම නිවාස “ලයින් කාමර” වගයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. (ජාතික මට්ටම්න් ගත්කළ මෙවැනි නිවාසයන්හි ප්‍රතිශතය 3.8%කි). මිට ගතවර්ෂ දෙකකට පමණ පුරුව කාලයකදී ත්‍රිතාන්‍ය වතු පාලකයින් විසින් වතු සේවකයින් සඳහා ඉදි කරන ලද ඉතා පැරණි මෙම පේළි නිවාස බොහෝමයක් වර්තමානය වනවිට ඉතා අඛණ්ඩ තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. නිරු එළිය හා වාතාගුරු අවම වීම, අධික තදබාදය, පොදුගලිකත්වයක් නොමැති වීම, අනු පවුල් බිජිවීම නිසා පවුල් කිහිපයකට එක් කාමරයක් තුළ ජ්වත් වීමත සිදුවීම මෙන්ම විවිධ වූ අඛණ්ඩයන්ට ගොදුරු වීම, අනාරක්ෂිත බව, සමාජ පිළිගැනීමක් නොමැති වීම සෞඛ්‍යයට හා ලුම්න්ගේ අධ්‍යාපනයට තුළුණුසු වට්පිටාවක් වීම ඇතුළු බොහෝමයක් සමාජයයිය ගැටුළු මෙමගින් නිර්මාණය වී ඇත.

වැවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින මෙවැනි නිවාස වර්ග තුනකට අයත් වේ.

1. තනි බැරෙක්ක (Single line Houses)

ඉදිරිපස ආලින්දයක් සහිත තනි කාමරයකින් සමන්විතය. ආලින්දය $5x5 \text{ ft}^2$ වන අතර මුළු නිවස 145 ft^2 ක් පමණ වේ. වැවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ මෙවැනි පේළි නිවාස $11,599$ ක් පමණ හඳුනාගෙන ඇත. රේට නිවාස එකක $73,539$ ක් පමණ ඇතුළත් වී ඇති අතර ඒවායෙහි පවුල් $81,900$ කට අධික ප්‍රමාණයක් ජ්වත් වේ.

2. යුගල බැරෙක්ක (Double Line Houses)

යුගල බැරෙක්ක ඉදිරිපස ආලින්දයක් සහිතය ඒළියකට කාමර $10 - 12$ ක් නිඩිය හැක. මෙහි පවුල් 02 ක් ජ්වත් වේ. බීම් වර්ග ප්‍රමාණය $145 - 175 \text{ ft}^2$ පමණ වේ. දැනට මෙවැනි නිවාස $5,468$ ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර රේට නිවාස එකක $69,613$ ක් ඇතුළත් වී ඇත. පවුල් $76,305$ ක් පමණ මෙම නිවාසවල ජ්වත් වන බව හඳුනාගෙන ඇත.

3. තාවකාලික නිවාස


වැවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ ක්ෂේත්‍රය පවුල් සංඛ්‍යාව වර්ධනය වීමත් සමග පවතින ඒළි නිවාස ප්‍රමාණය එම ක්ෂේත්‍රයේ ගුම්කියන්ට ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින්, පවතින ඒළි නිවාසවලට යාබදව ඉඩ ඇති ස්ථානවල තාවකාලික නිවාස ඉදිකර ඇත. වකරන් තහඹු සහ ඉටුරේදී යොදා තනා ඇති මෙම නිවෙස් ඉතා අඩු පහසුකම් වලින් යුත්තය. වතු ක්ෂේත්‍රයේ මෙවැනි තාවකාලික නිවාස $13,814$ ක් තුළ පවුල් $14,500$ අධික ප්‍රමාණයක් ජ්වත් වේ.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය: (වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරයේ දත්ත සම්ක්ෂණ වාර්තා, 2016)

වාසස්ථාන සම්බන්ධයෙන් වැවිලි ප්‍රජාව අත් විදින්නා වූ දුෂ්කරතා මග හරවා අනිමානයකින් යුතුව ජ්වත්වීමේ අයිතිය වැවිලි ප්‍රජාව වෙත ද නිමි කර දීමේ අනිලාගයෙන්, රජය විසින් ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් මත පදනම්ව ආරම්භ කරන ලද “වතු නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහන” 2015

වර්ෂයට පෙර “නව ජීතන නිවාස වැඩසටහන” ලෙසද, 2015 වර්ෂය කුල රජයේ දින 100 වැඩසටහනට සමගාමීව විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙසද ක්‍රියාත්මක වූ අතර 2016 වර්ෂයේ සිට “හරිත රන්” නිවාස වැඩසටහන” ලෙස ක්‍රියාවට නැංවින. පර්වස් 07 ක ඉඩකඩක වර්ග අඩ් 550 ක වපසරියකින් යුතු පානීය ජලය, විදුලිය හා සනිපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත “තනි නිවාස ඒකක” ලබා දීමේ මෙම වැඩසටහන කුණුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් අඛන්චලව ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර “පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම” අනුව යමින් 2020 වසර අවසන් වන විට තම අයිතියට වෙන් වූ පර්වස් 07 ක බිම් කඩක් සහිතව නිවාස ඒකක 56,500 ක් වැවැලි ප්‍රජාව වෙත හිමිකර දීම මෙම අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂාව වේ. නව නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා 2016.12.31 දින වනවිට රු.මි. 1,099 ක මුදලක් මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් වැය කර ඇත. එමෙන්ම, 2017 වසරේ දී රජයේ ප්‍රතිපාදන හා ඉන්දියානු රජයේ පුරුණ සභාය මත නිවාස යෝජනා ක්‍රම 3 ක් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා රජයේ අරමුදල් වශයෙන් රු.මි. 2,154 ක් සහ ඉන්දියානු ආධාර වශයෙන් රු.මි. 1,134 ක් වෙන් කරනු ලැබ ඇත. 2017.09.30 දිනට නිවාස වැඩසටහනේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මි. 700 ක්. නාය යාමට ලක්වූ හා නාය යාමේ අවදානමක් සහිත වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාවට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙමින් වතු සේවක පවුල් සඳහා මෙම නව නිවාස ලබාදීම සිදු කරනු ලබන අතර එට සමගාමීව ඒ සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම්, එනම් පානීය ජලය, විදුලිය සහ පිවිසුම් මාර්ග ලබාදීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවේ.

එමෙන්ම, වතු ජනතාව වෙත ඉඩම් අයිතිය හිමිකරදීමේ අනිලාපයෙන් නව රජය විසින් ගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් මත නිවාස ප්‍රතිලාභීන් සඳහා නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම සංකේතවත් කරමින් 2017-02-09 දින හැටන්හි දී අතිරේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රතිලාභී පවුල් 71 ක් සඳහා නිරවුල් ඔප්පු ලබාදීම සිදු කරන ලද අතර 2017.09.30 දින වන විට නිරවුල් ඔප්පු 446 ක් ලබා දී ඇත. තවදුරටත් ඔප්පු 6,624 ලබා දීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබේ ඇත.



6.1.1. "හරිත රන්" නිවාස යෝජනා ක්‍රමය (Green Gold) ගම්මාන /නගර සංකල්පය යටතේ - (Village/ Township Concept)

2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද නිවාස

රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත අරඹන ලද "හරිත රන්" නිවාස යෝජනා ක්‍රමය යටතේ 2017.09.30 දින වනවිට නිවාස 2,466 ඉදිකිරීම් සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර එයින් නව නිවාස 406 ක් 2017 වර්ෂයේ ස්වභාවික ආපදා තේතුවෙන් විපතට පත්වුවන් සඳහා අනුමත කර ඇත. නුවරඑළිය, හැටන්, කැගල්ල, බදුල්ල, රත්නපුර, මහනුවර හා ගාල්ල යන වැවිලි ප්‍රදේශ 7 ආවරණය වන පරිදි ඉදි කෙරෙන මෙම නිවාසයන් ඒවායේ ඉදිකිරීම්වල විවිධ අදියරයන්හි පවතී. නිවසක වට්නාකම රු. 1,000,000/- ලෙසට ඇස්කමීන්තු ගත කර ඇති මෙම වැඩසටහන යටතේ නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා වැය කෙරෙන මුදලන් 48% රජයේ ප්‍රදාන වශයෙන්ද, ඉතිරි 52% යො මුදල් වශයෙන් ද ලබා දෙන අතර, නාය යාමෙන් නිවාස අභිම් වුවන් වෙත පූර්ණ ප්‍රදානයක් වශයෙන් නිවාස ලබා දීම සිදු කෙරේ.

2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද "හරිත රන් නිවාස" වැඩසටහනෙහි ප්‍රගතිය (2017 සැප්තැම්බර 30 දිනට)

පිළිංචිකා	ජ්‍යේල්වැරු	වතු සමාගම	වත්තෙන් නම	කොටස	ඡේකක සංඛ්‍යාව	වත්කල ප්‍රතිපාදන (රු. ම.)	2017.09.30 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු. ම.)
1	ලැලුග	කොටගල	හෝමදාල	ස්වේක්ලන්ඩ්	15	15	0.38
2		මතුරට	හේදිස්	වේ. කොටස	22	22	12.55
3			ගොරස්ටර	ගෝවින්න	18	18	10.27
4		කොටගල	අරපොලකන්ද	ලිස්කිලන්	29	29	0.73
5		කොටගල	ගිකියනකන්ද	වෙස්ටි	12	12	-
6		කොටගල	වෝගන්	ඉද්දගොඩ	22	22	-
7		කොටගල	බල්කින්	ප්‍රින්සිලෝන්	21	21	-
8		හොරණ	කොබෝවෙල	කොබෝවෙල	21	21	-
9		හොරණ	නිවිවැටල්	හොම්	31	31	0.78
10		හොරණ	නිවිවැටල්	වෙම්පො	25	25	0.63
11		හොරණ	මිල්ලකන්ද	සෙන්.ගැයන්සිස්	6	6	-
12		හොරණ	මිල්ලකන්ද	ඇන්ඩ්‍රියන්	5	5	-
13		හොරණ	මිල්ලකන්ද	මිහිරිගිකුලේ	4	4	-
14		හොරණ	මිල්ලකන්ද	නිවි	5	5	-
15		තලවකුලේ	ඉන්දාල	මාවරල	10	10	-
16		නමුනුකළ	නැන්නෙෂන	දන්කොපුව	5	5	-
17		නමුනුකළ	පැලවත්ත	පහළ හෙවැස්ස	5	5	-
	ඡේකතුව				256	256	25.34

Contd...

1	ජ්‍යෙෂ්ඨ රුක්ති	බලන්ගොඩ	රාස්සගල	ඩිවැල්ල	12	12	0.30
2		හපුගස්තැන්න	මාදම්පෙ	නො.03	25	25	7.86
3		හපුගස්තැන්න	ස්පූන්ට්ටුව්	පාලම්කෝට්ටේ	20	20	6.79
4		හපුගස්තැන්න	හපුගස්තැන්න	UWK	31	31	6.45
5		බලන්ගොඩ	සෙසිල්ටන්	සෙසිල්ටන්	12	12	4.02
6		කැගල්ල	ඇමෙශීගම	ඇමෙශීගම (ගුරු නිවාස)	2	2	-
7		ප්‍රස්සිල්ලාව	දිවුරුම්පිටිය	වලන්ගල	32	32	8.74
8		කහවත්ත	පොරානුව	කිරිත්තල	18	18	-
9		කහවත්ත	ඒක්රල්ල	ඉලුක්කුණුර	12	12	-
10		අගලවත්ත	නුරාගල	පහල	1	1	-
11		අගලවත්ත	ක්ෂුඩ්චින්	පන්ටිය	1	1	-
12		බලන්ගොඩ	මිල්ලවිටිය	පාරකේටිය	1	1	-
13		බලන්ගොඩ	මැදකන්ද	වෙළකුණුර	18	18	-
14		බලන්ගොඩ	මුතුවාගල	පහල	4	4	-
15		හපුගස්තැන්න	හපුගස්තැන්න (R)	ලෙල්ලොපිටිය	54	54	-
16		හපුගස්තැන්න	හපුගස්තැන්න (T)	පහල වේවැල්කේටිය	18	18	-
එකතුව					261	261	34.16
1	ඩුඩු ලි	හපුගස්තැන්න	ප්‍රනාගල	ගැක්ටී/LLG	59	59	5.47
2		බලන්ගොඩ	අම්පිටිකන්ද	පහල/අධියර I	52	52	17.64
3		බලන්ගොඩ	අම්පිටිකන්ද	පහල/අධියර II	45	45	15.27
4		බලන්ගොඩ	අම්පිටිකන්ද	පහල/අධියර III	30	30	10.18
5		බලන්ගොඩ	අම්පිටිකන්ද	පහල/අධියර IV	30	30	6.45
6				බලැකුව්	43	43	9.25
7		හපුගස්තැන්න	බ්ලිලේ	400 Arce	13	13	0.33
8		බලන්ගොඩ	වේවැස්ස	දිවැල්දේද	18	18	3.87
එකතුව					290	290	68.46
1	ලුලු හු		යටිදෙරිය	නෙර්ත්ටෝර්ක්	20	20	2.40
2		ලලාන්	බෙන්ස්ටෝර්ක්	බෙන්ස්ටෝර්ක්	23	23	12.46
					25	25	-
3		කුලෙනිවැලි	දේවාලකන්ද	දුනාදින්	19	19	6.45
4			ඒදුරපොල	වෙස්ටි	10	10	-
5		ලලාන් රඛ්	වුඩුලන්ඩ්	තල්පිටිය	8	8	-
එකතුව					105	105	21.31

Contd...

1	රෝගීන්	කහවත්ත	කැටබෝල	කඩියාලන	20	20	0.50
2		ප්‍රස්සුල්ලාව	මූල්‍යය	මේඛිල්	25	25	7.24
3		JEDB	හෝප්	ටොප්	20	20	6.79
4		JEDB	මූල්‍යය	ඉහළ	20	20	6.16
5		JEDB	කන්බල්‍යය	මෙමමලයි (ගුරු නිවාස 3 ක් ද ඇතුළත්ව)	28	28	0.70
6		කහවත්ත	වෙස්ටිහෝල්	රිලාගල	15	15	5.09
7		කහවත්ත	බාකපල්	ටොප්	15	15	0.38
8			කැටුලා	හුනුකොටුව	20	20	2.15
9		කහවත්ත	ගලලොඩ්	පහල	20	20	4.30
10		කහවත්ත	ඉමුල්පිටිය	ගල්‍යය	20	20	4.30
11		ප්‍රස්සුල්ලාව	ලෙවිලෝන්	කොල්ග්‍රේන්	25	25	13.57
12		ප්‍රස්සුල්ලාව	චෙල්ටා	උතුර	6	6	0.15
13		කහවත්ත	සෝගම	පහල	20	20	4.30
14		කහවත්ත	බාකපල්	පහල	15	15	0.38
15		ඡල්කඩ්වා	ඡල්කඩ්වාව	දොතලාව	20	20	11.41
16		SLSPC	හුන්නස්ටිරිය	UMO	16	16	5.43
17		SLSPC	මෙල්ගෝඩ්	නිව් මෙල්ගෝඩ්	10	10	2.15
18			සිපලගල	ඡලගොල්ල	14	14	0.50
එකතුව				329	329	75.50	
1	න්වීන්	මුදුල්සිම	වෙන්වර්	Upper Lawrence	10	10	0.25
2		වටවල	ස්ට්‍රෝන්	ගුවහිල්	50	50	14.45
3		වටවල	ස්ට්‍රෝන්	ස්ට්‍රෝන්	50	50	-
4		බොගවත්තලාව	ලෙතන්ටී	ලෙතන්ටී	15	15	4.46
5		වටවල	ඇබෝට්ටිස්ලයි	ඡ්‍යෙල්රන්ස්ස්	20	20	0.50
6		වටවල	දික්ංය	ඡ්‍යුල්ටැන්ක්	20	20	4.30
7		වටවල	දික්ංය	දික්ංය	20	20	0.50
8		බොගවත්තලාව	කැමිපියන්	U/D	28	28	0.70
9		මඩුල්සිම	තෙරේසියා	කිලරි	30	30	0.75
10		මඩුල්සිම	කකස්වල්ඩ්	මේඛිල්	30	30	6.45
11		මඩුල්සිම	කකස්වල්ඩ්	පහල	25	25	5.38
12		මස්කේලිය	මුවන්ලෝ	මුවන්ලෝ	20	20	5.54
13		මස්කේලිය	මුවසාකුලේ	මුවසාකුලේ	20	20	4.30
14		මස්කේලිය	ස්ට්‍රෝන්ස්පී	සිම්බේල්	25	25	14.26
15		බොගවත්තලාව	පොයිස්ටන්	නිව්ටොය්න්	20	20	0.50
16		කැලෙනිවැලි	ඉන්ජේස්ට්‍රී	හොන්සි LD	20	20	6.76
17		කොටගල	බොගවත්ත	පහල	60	60	16.13
18		කොටගල	මුවන්ටරන්	දිමුල්ල	25	25	7.24
19		කොටගල	මුවන්ටරන්	මේඛිල්	55	55	21.42
20		කොටගල	මුවන්ටන්	DT	50	50	10.75
21		හොරණ	විල්කල්ට්‍රී	මුවසාඇල UD	30	30	6.45

Contd...

22	ශ්‍රී ලංකා	මස්කේලිය	ඉරුන්	තලන්කන්ද	20	20	5.54	
23		තලවකැලේ	තලවකැලේ	තලවකැලේ	20	20	4.30	
24		කොටගල	පුලිනිල්චි	YF	27	27	0.68	
25			ගොරවිල	B	17	17	0.38	
26			හැරින්ටන්		25	25	-	
27		කොටගල	පුලිනිල්චි	පුලිනිල්චි	1	1	-	
28		මස්කේලිය	බවුන්ස්වික්	එමලිනා	18	18	-	
29		මස්කේලිය	මවුසාකැලේ	Nyanza Upper	20	20	-	
එකතුව					771	771	141.99	
1	ඩුර්බින්	තලවකැලේ	ලොජ්	ලොජ්	15	15	5.09	
2		තලවකැලේ	ග්‍රේට් වෙස්ටන්	Scalpa	20	20	6.79	
3		තලවකැලේ	ගින්ලන්චිස්	කයිපුකැලේ	20	20	6.79	
4		කැලෙනිවැලි	පෙඩිරෝ	ලොවර්සිජ්	30	30	10.01	
5		පුස්සැල්ලාව	කොටලොජ්	පෝස්ට්ට්ව්බි	15	15	5.09	
6		තලවකැලේ	රෙඩිල්ල	ඉහළ	24	24	6.77	
7			වෛවරි	පෝට්මොර්	24	24	-	
8		වටවල	වෛල්ට්රිමි	මෙරායා	20	20	4.30	
9		වටවල	හෙන්ගෝෂ්ල්චි	ඇශේන් රැගල්ස්	25	25	8.48	
10		වටවල	හෙන්ගෝෂ්ල්චි	ආග්‍රා	24	24	5.06	
11		වටවල	හුට්ටිල්	විරෝමොර්	7	7	0.25	
12		TRI	සෙන්.කොමිස්	ඇහළ	25	25	7.74	
13		ඇල්පිටිය	ශින්	ඉහළ පුන්චල්ඡය	35	35	0.88	
14		මතුරට	ලිඩිස්ටේල්	AB	35	35	14.25	
15		මතුරට	කබරගල	ඉහළ	14	14	4.74	
16			වොල්ට්රිමි	කොට්ලෙෂ්න	48	48	10.32	
17			සෙන්.කොමිස්	ලෙමිලර්	7	7	2.20	
18			ගොරොටොග්ට්		50	50	-	
19			කොන්කොමියා	බෙන්මාර්ක්හිල්	16	16	-	
එකතුව					454	454	98.76	
මුළු එකතුව					2,466	2,466	465.52	

අව්‍යිජේද නිවාස

“නව ජීවන” නිවාස වැඩසටහන යටතේ අව්‍යිජේදව පැවැති නිවාස 10 ක වැඩ කටයුතු මෙම වර්ෂයේදී අවසන් කර ඇත. 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද “හරිත රන්” නිවාස එකක 1,430 අතුරින් නිවාස 493 ක වැඩ 2016 වර්ෂයේදීම නිමකර ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් ආදි යටිතල පහසුකම්ද සහිතව ප්‍රතිලාභී අයිතියට පත් කරන ලදී. එම ව්‍යාපෘතියේ 2017 දක්වා අව්‍යිජේදව පැවැති නිවාස 937 න් නිවාස 26 ක් 2017 වර්ෂයේ “හරිත රන්” නව නිවාස ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් කරන ලද අතර තවත් නිවාස 35 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු පාරිසරික බලපෑම් හේතුවෙන් අත් හිටුවන ලදී. ඒ අනුව මෙම වර්ෂයේ තව දුරටත් ත්‍රියාත්මක කරන ලද නිවාස එකක 876 න් නිවාස 238 ක ඉදිකිරීම් 2017 සැප්තැම්බර් මස අවසන් වන විට නිම කර ඇත.

හරිත රන් නිවාස වැඩසටහනේ අව්චිතීද ව්‍යාපෘතින්හි ප්‍රගතිය (2017.09.30 දිනට)

වැවිලි පුද්ගල	වතු සමාගම	වත්තේ නම	කොටස	නිවාස සංඛ්‍යාව	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු. තු.)		සෞතික ප්‍රගතිය	
					වෙන්කල ප්‍රතිපාදන	2017.09.30 දිනට ප්‍රගතිය	නිමකල	ක්‍රියාත්මක වෙළින් පවතින
ගාල්ල	නමුහුකළ	භූලන්දාව	Main/බුලුවාන	25	16.25	14.50	20	5
				25	16.25	14.50	20	5
රත්නපුරය	බලන්ගොඩ	බලන්ගොඩ	මාරුන්න	31	20.15	5.70		31
	බලන්ගොඩ	බලන්ගොඩ	දෙතනගල	19	12.35	8.50		19
	කහවත්ත	හෝප්	යාමුන්න	15	9.75	7.60		15
	බලන්ගොඩ	පෙවිලේල	ඉහළ	48	31.20	14.90		48
				113	73.45	36.70		113
බද්ධ්‍යල	අගරපතාන	පිටරත්මලේ	ඉහළ	47	30.55	10.20		47
				47	30.55	10.20		47
කැගල්ල	කැලෙනිවැලි	පානවත්ත	Pan - 04	14	9.10	7.90		14
	කැලෙනිවැලි	කුලුපතන	නිර්මල	9	5.85	5.00	9	
	කැලෙනිවැලි	කුලුපතන	වහරක	7	4.55	2.00		7
	කැලෙනිවැලි	කුලුපතන	කුලුපතන	4	2.60	2.10		4
	කැලෙනිවැලි	කුලුපතන	කුලුපතන	80	52.00	17.40	24	56
	කැගල්ල	අවාල	නිව්වරන්දර	12	7.80	1.60		12
				126	81.90	36.00	33	93
මහනුවර	පුස්සැල්ලාව	ගිරිගම	ගෝනාධික	15	9.75	2.10		15
	කහවත්ත	ගලමුදුන	Winedor Forest	11	7.15	2.20		11
		කැලැ බොක්ක	භූලන්කන්ද	23	14.95	7.70		23
	කහවත්ත	බොහිල්	බොහිල්	16	10.40	7.00		16
	කහවත්ත	කේශේෂ්‍ය	ඉහළ	15	9.75	5.00		15
				80	52.00	24.00	0	80
භැවන්	මස්කේලිය	බුවුන්ස්ස්ටික්	බුවුන්ස්ස්ටික්	25	16.25	14.60	25	
	හොරන	මහනිලු	මහගල	15	9.75	7.50		15
	කොටගල	ස්ටෝර්නික්ලිල්	රොසිටා	23	14.95	13.40	23	
	කැලෙනිවැලි	ඉන්ජේස්ට්‍රි	පොට්ටි	7	9.75	5.10		7
	බොග වන්තලාව	කොටියාගල	පහල	184	117.55	85.59	43	141
				254	168.25	126.19	91	163
දුවර එළිය	අගරපතන	භූවිල්	ඉන්කටන්	150	95.49	54.81	71	79
	ඇල්පිටිය	මැඩකොම්පා	ඉහළ/පහල	23	14.95	13.00	23	
	අගලවත්ත	වෙදමුල්ල	වෙවැන්ඩන්	58	37.70	5.30		58
				231	148.14	73.11	94	137
මුළු එකතුව				876	570.54	320.70	238	638

6.1.2. “ඉන්දියානු රජයේ සහාය යටතේ ඉදිවන” නිවාස ව්‍යාපෘතිය


ඉන්දියානු රජයේ සහාය යටතේ ආරම්භ කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වැවිලි ප්‍රජාව වෙත නිවාස ඒකක 4,000 ක් ඉදිකිරීමට නියමිත ව ඇත. එක් නිවසක වටිනාකම රු: මිලියනයක් ලෙසට ඇස්තමෙන්තු ගත කර ඇති අතර නිවසක් වෙනුවෙන් ඉන්දියානු රජය විසින් රු: 950,000/- ක්ද, අදාළ වැවිලි සමාගම විසින් රු:30,000/- ක් හා ප්‍රතිලාභිය විසින් 20,000/- ක්ද දායකත්වයක් සපයනු ලබයි. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය පානීය ජල පහසුකම්, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග ඇතුළු අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් සපයනු ලබයි. ඒ වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ 2017 වසර සඳහා රජයේ අරමුදල් මගින් රු:මි. 154 ක් ද ඉන්දියානු රජයේ ආධාර ලෙස රු:මි. 1,134 ක් ද වෙන්කර ඇත.

1 වන අදියර

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අදියර වශයෙන් නිවාස ඒකක 1,134 ක් ඉදි කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, 2017 සැප්තැම්බර් මස අවසන් වන විට නිවාස 75 ක ඉදි කිරීම් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කර ඇත. ඉතිරි නිවාස 1,059, විවිධ ඉදිකිරීම් අදියරයන්හි පවතී.

11 වන අදියර

මේ යටතේ, නාය යාමෙන් පීඩාවට පත් වුවන් හා නායෝමේ අවධානමට ලක් විය හැකි අධි අවධානම් ප්‍රදේශවල ජ්‍යවත් වන ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛතාව දෙමින් නිවාස ඒකක 2,866 ක් ඉදිකිරීමට නියමිතව ඇත. අදාළ වතු සමාගම, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය හා එක්ව ඉඩම් හඳුනා ගැනීම සිදුකර ඇත.

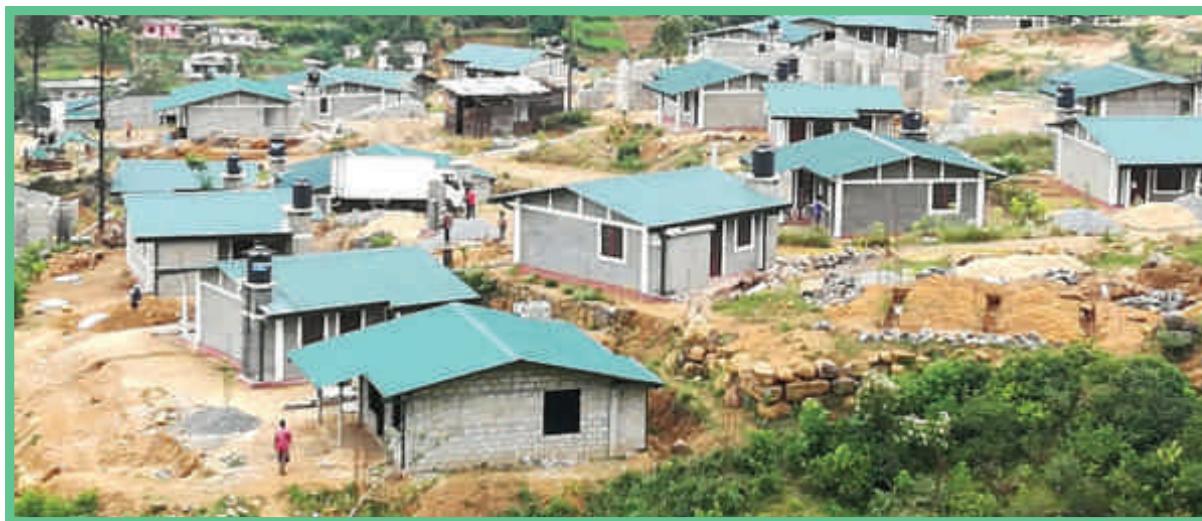

**“ඉන්දියානු රජයේ සහාය යටතේ ඉදිවන” නිවාස ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ ප්‍රගතිය
(2017 සැප්තැම්බර් 30 දිනට)**

වැවිල මානව සංරක්ෂණය හාර ප්‍රත්‍යුෂීය	වැනි	කොටස	නිවාස සංඛ්‍යාව	මූලික කටයුතු		ඉදි කිරීම් හෝතික ප්‍රගතිය				වැව අවස්ථා අදියර	නිම කරන ලද මූලික නිවාස සංඛ්‍යාව	
				නුම්‍ර සංඛ්‍යාව	අවස්ථා	ප්‍රේලැයින් තෙක්සිල	අවස්ථා	ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ සංඛ්‍යාව	ඉදිකිරීම් මට්ටම	වැනි	වහල මට්ටම	
හැටන්	බොග වාන	ඩ්‍රිඩ්වෙල්	155	125	148	92	36	40	16			
		ලිනස්ට්‍රික්	100	ආරම්භ කර ඇත	83	-	-					
		බොගවාන	100	ආරම්භ කර ඇත	101	-	-					
		එකතුව	355	125	332	92	36	40	16			
බද්ධේල	ලෙපර වත්ත	ලෙපරවත්ත	75	42	75	25	25					
		නාරංගල	50	20	50		-					
		එකතුව	125	62	125	25	25					
නුවර එළිය	චින් සිනන්	Factory site	200	146	158	146	40	21	33	19	33	
		මැද කොටස	204	65	91	38	33	5				
	චියගම බටහිර	1st Division	150	150	134	95	4	31	5	13	42	
		එකතුව	554	361	383	279	77	57	38	32	75	
මහනු-වර	හෙල් බොබි	හෙල්බොබි	100	94	100	88	59	29				
		එකතුව	100	94	100	88	59	29				
		එකතුව	1,134	642	940	484	197	126	54	32	75	

6.1.3. ප්‍රතිලාභී මූලිකත්ව නිවාස වැඩිසටහන

2005 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා වැවිල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව නිවාස එකක 30,000 ක් පමණ රජය ඇතුළු විවිධ ආයතන මූලිකත්වයෙන් ඉදිකර ඇති අතර, එම ඉදිකිරීම් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනට මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයක් වන වැවිල මානව සංරක්ෂණ හාරයේ සම්බන්ධිකරණය යටතේ වතු සේවක නිවාස සමූපකාර සම්ති (EWHCS) හරහා සිදු කර ඇත.

ඉහත ක්‍රමයන්ට පරිභාගිතව යළින් නවතම සංකල්පයකට යොමු වූ මෙම මෙම අමාත්‍යාංශය, 2017 වර්ෂයේ සිට “ප්‍රතිලාභී මූලිකත්ව” නිවාස සංකල්පය හඳුන්වා දී ඇත. ඒ අනුව එම ක්‍රමය යටතේ, රැකියාව කරනු ලබන වතුයායේම අදාළ නිවාස ඉදිකරනු ලබන බැවින්, ප්‍රතිලාභීන්ට මෙම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව පුරුණ වගකීම දරමින් තමාට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් ශක්තිමත්ව හා මනා පිරිමැස්මකින් ඉදිකිරීම් සිදුකළ හැකි අතර, නිවාස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති මුදල ඉතිරි වේ නම් එම නිවාසේ අමතර සංවර්ධන කටයුතු සඳහාද එය යෙදවිය හැකි වේ. මේ කුලින් වැවිල ප්‍රජාවට කමත්ගේම තීරණ අනුව තම දායකත්වයෙන් ඉදිකරනු ලබන නිවාසක අයිතිය හිමිවන බැවින් යැපුම් මානසිකත්වයෙන් තොර අහිමානී පුද්ගලයින් බවට ඔවුන් පත්වනු ඇත.

“හරිත රන් නිවාස” ක්‍රමයේදී මෙන්ම මෙහිදී ද, පර්වස් 07 ක සූම් ප්‍රමාණයක අයිතිය එක් පුද්ගලයෙකුට හිමිවන අතර, වර්ග අඩ් 550 ක නිවාසක අයිතිය ලැබේ. වැරන්ඩාවක්, ආලින්දයක්, නිදන කාමර


දෙකක්, මුළුතැන්ගෙයක් සහ යාබදු වැසිකිලියකින් එක් නිවසක් සමන්විත වේ. මෙම නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා මුලික වියදම වශයෙන් රු. 50,000 හා ඉදිකිරීම වියදම වශයෙන් (Preliminary) 950,000/- ක් ද ඇස්තුමෙන්තු කර ඇත. ඒ අනුව එක් නිවසක වට්නාකම රු. 1,000,000 කි. එම මුදලින් 52% ක් සෞය මුදලක් ලෙස වසර 15 කින් අය කර ගැනීමේ පදනම මත ලබාදෙන අතර, ඉතිරි 48% ප්‍රදානයක් ලෙස ලබා දේ.

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය:

- වතු අධිකාරිය වෙතින් ඉඩම් ලබා ගැනීමට අදාළ කටයුතු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හරහා වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය මැදිහත්ව සිදුකරනු ලබන අතර, තෝරාගනු ලබන ප්‍රතිලාභීන්ට ඉඩම් කොටස් පවරා දෙනු ලැබේ.
- ප්‍රතිලාභීන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් (5 - 8 කින්) සකසා, එම කණ්ඩායම් සඳහා නායකයින් තෝරාගනු ලබයි.
- නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම නිවාස කම්ටුවක් හරහා සිදු කරන අතර අදාළ කණ්ඩායම් නායක, වතු සේවක සමූහකාර සමීක්ෂකයෙහි (EWHCS) සහායති, ලේකම් හා භාණ්ඩාගාරික හා වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ (PHDT) නිලධාරීයෙකු ගෙන් එය සමන්විත වේ.
- නිවාස ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩුම මිලට ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම කම්ටුව මගින් සිදුකරනු ලබන අතර නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ට ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමට ඔවුන් බැඳී සිටී.

මෙම වැඩ සටහන තව දුරටත් පූජ්‍ය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් විවිධ ආයතන වෙතින් අභිජාය ප්‍රකාශ (EOI) කැඳවීමද මේ වනවිට සිදුකර ඇත.

අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිකරනු ලබන නිවසක සැලැස්ම

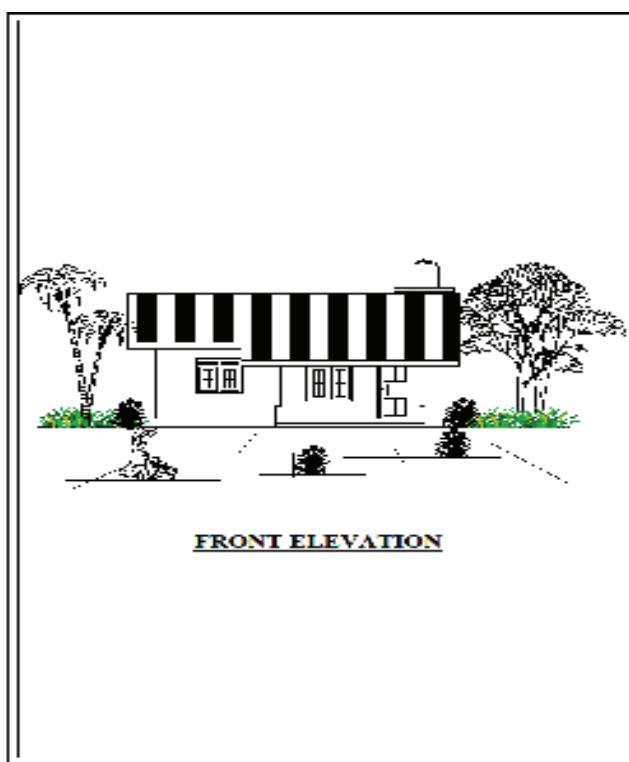

ඉදිරි පෙනුම

නිවාස සැලැස්ම





6.2. පසුගාමී ප්‍රදේශවල සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය

ඉතා අවම පහසුකම් යටතේ ජ්‍යෙන් වන වතු ජනතාව සඳහා පානීය ජල ව්‍යාපෘති ඇති කිරීම, වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම, ප්‍රවේශ මාර්ග අළත් වැඩියාව / ඉදිකිරීම, ප්‍රධිපෙළවල් ඉදි කිරීම, ලයින් කාමර වහල නැවත සෙවිලි කිරීම, ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම, ආගමික සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම යනාදී විවිධ වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ඊට අමතර වශයෙන් හඳුසි ආපදා තත්ත්වයනට පත්වූ වැවිලි ප්‍රජාව වෙනුවෙන් තාවකාලික වාසස්ථාන සකස් කිරීම හා ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමද මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

පසුගාමී ප්‍රදේශවල සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 500 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත. ඒ යටතේ, 2016 වසරේ අවසන් කාරුණික අනුමත කරන ලද 2017 වසරට අව්‍යුත්සේද වූ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රු. මි. 10 ක් පමණ වෙන් කර ඇත.

අව්‍යුත්සේද ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය (2017.09.30 දිනට)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	2017 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු. මි.)	2017.09.30 දිනට වියදම (රු. මි.)	2017.09.30 දිනට නිමකළ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
1	ශ්‍රී බං පිටි	2	1.42	0.89	2
2	ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය	2	2.56	1.00	1
3	ଆගමික සිද්ධීස්ථාන හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය	3	2.18	1.27	3
4	ජල ව්‍යාපෘති	3	2.10	1.66	3
5	පාසල් සංවර්ධනය	1	0.13	-	1
6	වෙනත් (ආරක්ෂිත බැමියනාදිය)	2	0.68	0.49	2
7	වැසිකිලි ඉදි කිරීම (වැසිකිලි 10)	1	0.23	0.22	1
8	මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති	1	0.38	0.29	1
එකතුව		15	9.68	5.82	14

2017 වසරේ ආරම්භ කරන ලද නව වැඩිසටහන් හා එහි ප්‍රගතිය.

6.2.1. වහල දිරාපත්වීම හේතුවෙන් වාසස්ථානයකට නුසුදුසු තත්ත්වයේ ඇති පේලි නිවාස 1640 ක වහල නැවත සෙවිලි කිරීම.

පේලි නිවාස වල ජ්‍යෙන් වන සමස්ථ වැවිලි ප්‍රජාව වෙනුවෙන් නව නිවාස ඉදිකිරීම දීර්ස කාලීන ව්‍යාපෘතියක් වන බැවින්, එකෙක් එම ප්‍රජාවගේ වාසස්ථානයන්හි තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ අතුරු පියවරක් වශයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ඒ අනුව, 2016.12.31 දින වනවිට රු. මි. 135 ක පිරිවැයක් දරමින් නිවාස එකක 1,605 ක වහලයන් නැවත සෙවිලි කර ඇති අතර එයට අමතරව තවත් නිවාස එකක 1,200 ක වහල නැවත සෙවිලි කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේද රු. මි. 60 ක් මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් වෙන්කර ඇත. සැළ්තුම්බර මස අවසන් වන විට රු. මි. 26 ක මුදලක් වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරයේ නුවරඑළුය, හැටන්, කැගල්ල, බදුල්ල,

රත්නපුර, මහනුවර යන වැවිලි ප්‍රදේශ වෙත ලබා දී ඇති අතර, එළි නිවාස 452ක වහළ ඒ යටතේ සෙවිලි කර ඇත.

6.2.2. සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.

ජල උල්පත් බොහෝමයක් වතු ජනාධාරී ස්ථාන ගත වී ඇති කදුකර ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වුවද සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා ගැනීමේ හැකියාව වතු ජනතාව වෙත හිමි වී ඇත්තේ ඉතා අල්ප වශයෙනි. ජල සැපයුම් අනාරක්ෂිතව තිබේ හේතුවෙන් ජලය මගින් පැතිරි යන පාචනය වැනි රෝග බොහෝමයකට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් වැවිලි ප්‍රජාවතුල පවතින බැවින්, එසේ හදුනාගත් ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ගනිමින් ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර ඇත.

මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාවත නංවනු ලබන 2016 - 2020 ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව 2020 වර්ෂය අවසන් වන විට ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම 500ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත අතර එහිදී පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කර ඇත.

- නව ජල ධාරාවන් සහ ජල උල්පත් හදුනා ගැනීම
- ජල ධාරාවන් සහ ජල උල්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ අවට පිහිටි රක්ෂිත ප්‍රදේශයන්ට අයත් සීමාවන් ලකුණු කිරීම
- විවෘත ප්‍රදේශයන් හි මළුපහ කිරීම වැළැක්වීමට වතුවල විවේකාගාර ඉදි කිරීම.
- ජල සම්පාදන හා ජල පෙරන ක්‍රමයන් හදුන්වා දීම
- ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය
- ප්‍රතිලාභ දායකත්ව යෝජනා ක්‍රමය ගක්තිමත් කිරීම. මෙය දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වේ.

2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර, සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වූ ජල ව්‍යාපෘති 04 න් 02 ක වැඩ 2017 සැප්තැම්බර මස අවසන් වන විට නිමාකර ඇති අතර 2017 වර්ෂය තුළදී ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 80 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා R. මී. 36 ක් වෙන්කර ඇත. 2017.09.30 දින වනවිට නව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 62 ක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඉන් එක් ව්‍යාපෘතියක් අවසන් කර ඇත. ඉන් ව්‍යාපෘති 54 ක් වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර තවත් ව්‍යාපෘති 08ක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. 2017.09.30 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය R.මී. 17 ක් වන අතර අමාත්‍යාංශය විසින් 2016.12.31 දක්වා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වැයකර ඇති සමස්ථ පිරිවැය R.මී. 77 කි.

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතින් (2017.09.30 දිනට)

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතන	ජල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ප්‍රේරණා නීති රුළුණු ප්‍රතිඵල රුළුණු							
		ප්‍රේරණා	නීති	රුළුණු	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල	රුළුණු	ප්‍රතිඵල	රුළුණු
වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය	54	8	5	24	5	5	3	4	
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල	08	5	-	2	-	-	1	-	
එකතුව	62	13	5	26	5	5	4	4	

6.2.3. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම

දත්ත සම්ක්ෂණ වාර්තා අනුව වැවිලි ප්‍රජාවගෙන් 25 % කට අධික ප්‍රමාණයක් සඳහා දියුණු සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලැබේ නොමැති බව පෙනී යයි. ලයින් කාමරවල ජීවත් වන එම ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත්

සහිපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් 2016 - 2020 යන වසර පහ කුලදී නව වැසිකිලි 20,000 ක් නිම කිරීමට අපේක්ෂිත අතර 2017 වර්ෂය ආරම්භ වනවිට රු. මි. 60 ක් වැයකාට වැසිකිලි 1,232 ක් ඉදිකර ප්‍රතිලාභීන් වෙත පවරා ඇත. එමෙන්ම 2017 වර්ෂය සඳහා වැසිකිලි 650ක් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් රු.මි. 37ක මුදලක් වෙන්කර ඇති අතර 2017.09.30 දින වනවිට වැසිකිලි 589 ක් ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඉන් වැසිකිලි 489 ක් වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, කැගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් වැසිකිලි 100ක ඉදිකිරීමේ කටයුතු අරඹා ඇත. 2017 සැප්තැම්බර 30 දිනට සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මි. 17 කි.

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැසිකිලි ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතින් (2017.09.30 දිනට)

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අයත්තනය	වැසිකිලි සංඛ්‍යාව	පැවත්වනු ඇති සංඛ්‍යාව	වැවිලි	වැවිලි	වැවිලි	වැවිලි	වැවිලි	වැවිලි	වැවිලි
වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය	489	60	137	20	102	52	60	58	
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	100	-	-	-	-	100	-	-	
එකතුව	589	60	137	20	102	152	60	58	

6.2.4. පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම / නවීකරණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැවිලි ක්ෂේත්‍රය ආරම්භ වූ මුල් යුගයේ පටන් රැකියාවන් හි නිරත ප්‍රජාවගේ අවු 02 - 05 දක්වා ලුමුන්ගේ රැකවරණය පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හරහා ක්‍රියාත්මක විය. වයස අවුරුදු 2 ට 5 අඩු දරුවන් රැක බලා ගැනීම හා අවුරුදු 3-5 අතර ලමයින්ගේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම වර්ධනය, ස්ව හාජාව දියුණු කිරීම, සෞන්දර්ය කුසලතාවයන් හා බුද්ධිමය හැකියාවන් වර්ධනය, දරුවන් පාසල් අධ්‍යාපනයට පුරු කිරීම, යනාදී කාර්යාලයන් පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හරහා සිදු කරනු ලැබේ.

වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ලුමුන්ගේ මුල් පළමාවය රැකවරණ කටයුතු සම්බන්ධ මැදිහත්වීම සිදුකරනු ලබන්නේ වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය විසිනි. ඒ අනුව වතු කළමණාකාරීත්වය යටතේ මේ වනවිට පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 1,544 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ඉඩ පහසුකම් තොමැතිවීම, උපකරණ හිත්වීම, නිසි තැබ්දිවක් තොවීම, රැකවරණය සපයන්නන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ ගුණාත්මකභාවය යනාදී කරුණු පදනම් කරගනීම් කරන ලද ප්‍රමිති වර්ගීකරණය අනුව මධ්‍යස්ථාන අතුරින් 62% ක් "ඒ" සහ "ඩ්" ගේණ්ඩ් ලෙසද අවම පහසුකම් ඇති 38% ක් "සී" සහ "ඩී" ගේණ්ඩ් ලෙසද හඳුනාගෙන ඇත. එසේ "සී" සහ "ඩී" ගේණ්ඩ් ලෙස හඳුනාගත් පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 550 ට අධික වන අතර මෙම මධ්‍යස්ථාන කඩින්ලින් සංවර්ධනය කළ යුතුව ඇත.

ලේක බැංකු ව්‍යාපෘතිය මගින් 2015 - 2020 කාල පරිච්ඡේද තුළ තොරාගත් පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනයද ඇතුළත් මුල් පළමාවය සංවර්ධනය හා රැකවරණය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු බොලර් දස ලක්ෂ 10 ක මුදලක් වෙන්කර ඇත.

රජයේ අරමුදල් යොදවමින් මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 100ක්, වර්ෂ 2020 වන විට වැවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂිතය. 2017 වර්ෂය ආරම්භවන විට රු.මි. 16 ක පිරිවැයක් දරමින් මධ්‍යස්ථාන 21 ක් සංවර්ධනය කර ඇති අතර, මෙම වර්ෂයේදී ද ඒ සඳහා රු.මි. 16 ක් වෙන්කර, වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. ඒ අනුව පළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන අභිත්වැඩියාව අරඹා ඇති අතර, එක් මධ්‍යස්ථානයක අභිත්වැඩියාවන් අවසන් කර ඇත.

2017 වර්ෂය සඳහා ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම / සංවර්ධනය කිරීම
(2017.09.30 දිනට)

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතන	ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	ප්‍රාදේශීය මට්ටමීන්				
		ලැංඡ	නොවන	රුඩාන්ත්‍රික	ගාලු	රුඩාන්ත්‍රික
වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය	19	9	2	3	4	1

6.2.5. ප්‍රවේශ මාර්ග සංවර්ධනය

ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා වතු මාර්ග ජාලය මතාලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය, සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව සිදුකළ යුතුව ඇත. ගුම්කයන්ගේ දෙනීක ගොනගමනයට, නිෂ්පාදන හා වෙළඳ හාණ්ඩ ගුණාත්මක ලෙස ප්‍රවාහනයට මෙන්ම රෝගී අවස්ථාවන්හිදී තුළසි ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම යනාදී කරුණු සැලකිල්ලට ගත් කළ ඉතා අඛණ්ඩ තත්ත්වයේ පවතින වතු ප්‍රවේශ මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය / ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තක්ව පවතී.

එම අනුව මෙම අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ වැවිලි ප්‍රජාව ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රවේශ මාර්ග ලබා දීම, ප්‍රධාන ආයතන පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂිත බැම් සැකසීම සිදු කරනු ලබන අතර, විශේෂයෙන් රෝගී රෝහල් වෙත නිසි ප්‍රවේශ මාර්ග තොමැති වතු කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරමින් එකී මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 2017 වර්ෂය තුළදී රු.මි. 125 ක් (කිලෝ මිටර් 25 ක් සඳහා) වෙන්කර ඇති අතර වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හරහා එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

6.2.6. පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය

ක්‍රිඩා පහසුකම් සැපයීම හා වැවිලි ප්‍රජාවගේ පොදු ජන ජීවිතය යථාවත් වතු පිළිසස අවැසි වෙනත් පහසුකම් විශේෂයෙන් ආගමික හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන නගා සිටුවීම, සුහසාධන සංගම් වෙත අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි. 2015 සහ 2016 වර්ෂයන් තුළදී මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා රු.මි. 255 ක් වැය කර ඇති අතර මෙම වර්ෂය තුළදී වෙන්කර ඇති මුදල රු.මි. 226කි. 2017 වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘති 500 ක් සඳහා අනුමත කර ඇති අතර එහි මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මි. 29 කි .

පසුගාමී ප්‍රදේශ සංවර්ධනය සඳහා 2017 වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද නව ව්‍යාපෘතින්

ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය	ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය		2017 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අභේක්ෂිත ඒකක සංඛ්‍යාව	වෙන්කල රු.මි.	2017.09.30 ක්‍රියාත්මක කළ ඒකක සංඛ්‍යාව	2017.09.30 දිනට වියදම රු.මි.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
	වැ. මු. ස. හා.	පා. ලේ.					
වහල තැවත සේවිලි කිරීම	✓	✓	1640	60.00	452	25.4	42.3
ඡල සම්පාදනය	✓	✓	80	36.40	62	4.02	11.04
වැසිකිලි ඉදිකිරීම	✓	✓	650	37.00	589	16.62	44.9
ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නවීකරණය	✓		23	16	19	1.56	9.75

කාර්යසාධනය (ප්‍රගතිය) - 2017 සහ ඉදිරි වැවසටහන් _____

රේඛල් මාරුග සංවර්ධන ව්‍යාපති	✓		15	125	9		
ක්‍රිඩා පිටි / ප්‍රවේශ මාරුග ආගමික / සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය වෙනත් පොදු පහසුකම්	✓	✓	500	225.60	405	58.90	26.1
			500.00		106.5		21.3

6.3. ජීවත්තාය සංවර්ධනය.

වර්තමාන තාක්ෂණික ප්‍රවත්තතාවයත් සමඟ වැවිලි අංශය කිහිප ආකාරයකින් අහිසෝගයට ලක්වේ ඇත. එයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ වත්මන් පරපුර වැවිලි අංශයේ දැනට පවතින සාම්පූද්‍යාධික ක්‍රමවේදයනට අනුගත වීමේදී දක්වන පසුගාමිත්වය, ගුමයට වැඩි වැටුපක් හා සමාජයේ පිළිගැනීමක් අපේක්ෂා කිරීමයි. මෙහි අවසන් නිෂ්ප්‍ර වී ඇත්තේ නිසි නිපුණතාවයක් හෝ පුහුණුවක් නොමැතිව තරුණ වැවිලි ප්‍රජාව ක්ෂේත්‍රයෙන් බැහැරව වෙනත් ඉලක්ක සෞයා තොපැහැදිලි අනාගතයකට පියමන් කිරීමයි.

එකී තත්ත්වය මග හරිමින් වැවිලි ක්ෂේත්‍රයට පරිබාහිරව සූදුසු රැකියා ලබා ගැනීමේ අවස්ථා වැඩි කිරීමටත්, ගුම්කයින් වැවිලි ක්ෂේත්‍රයට ආකර්ෂණය කිරීමටත්, ඒ තුළ රඳවා ගැනීම සඳහා සූදුසු වැඩි පරිසරයක් ඇති කිරීමටත්, වැවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ හිඳිමින් අතිරේක ආදායමක් ඉපයිමට ඇති අවස්ථාවන් වැඩි කිරීමටත්, ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් අවධානය යොමු කර ඇති අතර ඒ අනුව, නිපුණතා සංවර්ධනය හා වත්තීය පුහුණුව, ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම (කාන්තාවන් හා තරුණ තරුණියන්) සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, තාක්ෂණික යානය හා පුහුණුව ලබාදීම, උපකරණ හා පහසුකම් ලබාදීම, දිලිඹුකම තුරන් කිරීමේ වැඩිසටහන් ඇතුළු සමාජ සවිබල ගැන්වීම් වැඩිසටහන් රාජියක් මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් කියාත්මක කරනු ලබයි.

6.3.1. ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

අතිරේ ජනාධිපතිතුමාගේ විශේෂ අවධානයට පාත්‍රවූද, ජාතික අවශ්‍යතාවක් සේ සලකා ක්‍රියා කරන්නාවූ ද, සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ තැබීම, වකුගත් රෝග මැඩ්ලිම, මත්දුච්‍රා තිවාරණය, පරිසර සංරක්ෂණය, ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය වැනි වැඩිසටහන් ක්‍රියාත්මක කොට වැවිලි ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සඳහා 2015 - 2016 වර්ෂයන් තුළදී රු.මි. 5 ක් පමණ වැයකර ඇති අතර, 2020 වර්ෂය වනවිට දැනුවත් කිරීමේ වැඩි සටහන් 1000 ක් පමණ දියත් කරමින්, ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම හා පෝෂණ තත්ත්වය මෙන්ම, ආකල්ප සංවර්ධනය තුළින් ද මුවන් නව මාවතකට යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කර ඇත. මිත අමතරව, වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා පරිසර හා ජල සංරක්ෂණ වැඩිසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙම ව්‍යාපති සඳහා 2017 වර්ෂයේදී රු.මි. 10ක් වෙන්කර ඇත. සැපේතුම්බර අවසන් වනවිට රු.මි. 5 ක් පමණ යොදවා 78% ක පමණ ප්‍රගතියක් අත්පත් කරගනිමින් වැඩිසටහන් 155ක් පවත්වා ඇත.

6.3.2. දිලිඹුකම පිටු දැකීමේ වැඩිසටහන

සවිමත් ආර්ථික ගක්තියකින් හෙබි අදින ජාතියක් ගොඩ නංවා "පතිරුප දේශයක් බිජ කිරීම" හා එක්සත් ජාතින්ගේ තිරසර සංවර්ධන වැඩිසටහනට සමගාමීව එහි ප්‍රථම අපේක්ෂාව වූ දිලිඹුකම ජනතාව තුළින් තුරන් කිරීම උදෙසා අතිරේ ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත වර්ෂ 2030 වනවිට දිලිඹුකමින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිජ කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, 2017 වර්ෂය "දිලිඹුකම පිටු දැකීමේ වර්ෂය" ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. ඉහළම දරිද්‍රතා අගයන් පිළිබිමු කරනු ලබන වැවිලි ප්‍රජාව ඉලක්ක කොට ස්වයං රැකියා වැඩිදියුණුව, ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය, කුඩා පරිමාණ ගෙවතු වගාව, නිවාස

හා ප්‍රංශ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයන්හි ගෙවතු වගාව, මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව හා මූවු ඉඩම් වගාව යනාදී තේමාවන් යටතේ විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් රු.මි. 30 ක් වෙන්කර ඇති අතර 2017 09.30 දින වනවිට ක්‍රියාකාරකම් 1050 ක් ක්‍රියාවට නැංවා ඇත.

මෙම වැඩසටහන වඩාත් ප්‍රායෝගිකව ඉටු කරනු ලැබුණු පිණිස “ස්වයං රැකියා ව්‍යුහ අරමුදල” යටතේ යය පහසුකම් ලබාදීම සඳහා ලංකා බැංකුව සමග ගිවිසුමකටද එළඹෙන ලදී.

6.3.3. නිපුණතා සංවර්ධනය, යොවනයින් බල ගැන්වීම

අ.පො.ස (සා/පෙළ) හා අ.පො.ස. (ල/පෙළ) න් පසුව අධ්‍යාපනය හැරයන්නන් නිසි ජ්වනේපාය කුමවේදයකට අනුගත කරවීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය හා වෘත්තිය පුහුණුව ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වේ. ඒ අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ප්‍රජා ගක්ති ව්‍යාපෘතිය හරහා දහසකට අධික වැවිලි ක්‍රේතුයේ තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්ක කොට වැඩසටහන් 30 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර 2017 වර්ෂයේදී මේ සඳහා රු.මි. 10 ක් වෙන්කර ඇත.

6.3.4. ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම

නායකත්වය පුහුණුව හා සංවර්ධන කාර්යයන් කෙරෙහි ප්‍රජා දායකත්වය ඉහළ නැංවීම උදෙසා ප්‍රජාව කුල උද්යෝගයක් ඇති කිරීම කෙරෙහි අමාත්‍යාංශය විසින් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම හා නව ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. මේ යටතේ හැටන්, නොරුවුහි පිහිටා ඇති ක්‍රිඩා සංකීරණය සංවර්ධනයට ද අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති අතර හැටන් ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්ගේ හා තරුණ ප්‍රජාවගේ ක්‍රිඩා කොළඹයන් ඉහළ නැංවීම මෙමගින් අපේක්ෂා කරනු ලබයි. මේ සඳහා මෙම වර්ෂයේදී රු.මි. 10 කට ආසන්න මදලක් වෙන්කර ඇති අතර රු.මි. 5 ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක් 2017.09.30 දින වන විට අත්කරගෙන ඇත.







07

අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 වසරේ අත්පත් කර ගන්නා ලද විශේෂ ජයග්‍රහණ

7.1. වැවිලි ප්‍රජාව සඳහා ඉඩම අයිතිය තහවුරු කර දීම.

ප්‍රථම වතාවට වැවිලි ප්‍රජාව වෙත නිරවුල් ඉඩමක අයිතිය හිමිකර දීම අතිරේ ජනාධිපති මෙත්පාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.02.09 දින හැටන් පුට්ටිල් වත්‍යායේදී සිදු කළ අතර එහිදී නිවාස ප්‍රතිලාභීන් 71 දෙනෙකු සඳහා නිරවුල් ඔප්පු ප්‍රදානය කරන ලදී.

7.2. නව නිවාස 10,000 ක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉන්දියානු රජයේ එකත්වය ලැබීම

ඉන්දිය අගාමත්‍ය ගරු නරේන්ද්‍ර මෝදී මැතිතුමාගේ ග්‍රී ලංකා සංචාරය තුළදී ඉන්දිය දෙමළ සම්බන්ධයක් ඇති වැවිලි ප්‍රජාව ඇතිම සඳහා අවස්ථාවක් උදා කර දෙමින් රස්වීමක් සංවිධානය කිරීම හා ඉන්දිය රජයේ පූර්ණ ආධාර යටතේ නව නිවාස ඒකක 10,000 ක් වැවිලි ප්‍රජාව වෙත හිමි කරදීම සඳහා ඉන්දිය රජයේ අනුග්‍රහය ලබා ගැනීම.

7.3. ප්‍රතිලාභී මූලිකත්ව නිවාස ක්‍රමය හඳුන්වා දීම.

කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය මත පදනම්ව නිවාස ඉදිකිරීමේ දී ඇතිවන ගැටළු මගහරවා ගැනීම පිණිස මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන ලද කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පදනම් කරගත් නිවාස ඉදි කිරීමේ ක්‍රමය වෙනුවට ඉදිකිරීම් සඳහා වන ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිලාභීන් වෙත යොමුකර, ඔවුන්ගේම ගුම දායකත්වයෙන් නිවාස ඉදි කිරීමේ සංක්ලේෂණය හඳුන්වා දීම හා ඒ තුළින් වඩාත් ගුණාත්මක නිවසක හිමිකාරීත්වය වැවිලි ප්‍රජාව වෙත ලබා දීම.

7.4. වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ දරුවන් වෙත පෝෂණ අතිරේකයක් ලබා දීම

ජනාධිපති කාර්යාලය සමග සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ලේකම් කාර්යාලය එක්ව සකස් කරන ලද පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (2017- 2020) මැතින් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති කාර්යාලය අනුව යම්න්, ලමා මත්දේපෝෂණයේ ඉහළම දත්ත පිළිකිරී කෙරෙන වතු අංශයේ දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා වන දීර්ස කාලීන සැලැස්මක එක් පියවරක් ලෙස වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 3 - 5 වයසැති දරුවන් වෙත පෝෂණ අතිරේකයන් ලබා දීමේ වැඩ සටහන ආරම්භ කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.

7.5. හැටන්, පුලුලැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (PVTC) වැඩි දියුණු කිරීම.

වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ තරුණ තරුණීයන් සඳහා කාලීන වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් හිමිකර දීමේ අතිලාපනයෙන් හැටන් පූල් බැන්ක් හි පිහිටි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉන්දිය රජයෙන් රු. මි. 199 ක ආධාර ලබා ගැනීම හා ඒ සඳහා ඉන්දිය රජය සමග ගිවිසුමකට එළඹීම.

08

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන

8.1. වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය

8.1.1. පසුබීම්

“වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය”, වැවිලි අංශයේ වෙශෙන ජනතාවගේ ජ්‍යෙනෝපාය මාරුග වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා, 1982 අක 17 දරන සමාගම් පනත යටතේ, “වතු නිවාස හා සමාජ සංවර්ධන භාරය” නමින් 1992 සැප්තැම්බර මස 18 වන දින ස්ථාපිත කරන ලද සමාගමකි.

1992 දී රජය ගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට අනුව ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට සහ ශ්‍රී ලංකා වැවිලි සංස්ථාවට අයත් වතු පවරාගෙන එම වතුවල කළමනාකාරීත්වය ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් 23ක් යටතේ පුද්ගලික අංශය වෙත පවරා දෙන ලදී. පොදුගලීකරණයෙන් කෙටි කළකට පසු, 2002 ඔක්තෝම්බර මස 25 වන දින, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා වැවිලි සංස්ථාවේ සමාජ අංශ ඒකාබද්ධ කරමින් වැවිලි අංශයේ වෙශෙන ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සහ අනෙකත් සමාජ සූහසාධන කටයුතු මෙන්ම ජ්‍යෙනෝපාය මාරුග වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා “වතු නිවාස හා සමාජ සංවර්ධන භාරය”, “වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය” ලෙස ප්‍රතිනාම ගත කරන ලදී. මේ වන විට මෙම භාරය 2007 අක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කර ඇත.

යෙරෝක්ත ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය මගින් පහත දැක්වෙන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරයි.

- වතු ප්‍රජාවේ ජ්‍යෙනෝපාය වෙනුවට ස්වයං අයිතිය සතු තහි නිවාස සුමිසු පුද්ගලයන් වෙත ලබාදීම.
- පැරණි ජ්‍යෙනෝපාය අලුත්වැඩියා කිරීම හා ඒවායේ වහළ නැවත සෙවිලි කිරීම (re-roofing).
- ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
- ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම හා සුදුසුකම් ලත් ලමා සංවර්ධන නිලධාරීන් හඳුන්වා දීම.
- ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
(මාරුග/ගොඩනැගිලි/ආගමික මධ්‍යස්ථාන යනාදිය)
- සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාදීම හා සමාජ සංවර්ධන කටයුතු
- අලෙවි පහසුකම් සළසා දීම
- ජ්‍යෙනෝපාය මාරුග සඳහා පහසුකම් සළසා දීම


8.1.2. සංවිධාන ව්‍යුහය

“වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය”, කළුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරන ලද ආයතනයකි. මෙය, වැවිලි අංශයේ දස ලක්ෂයකට අධික ජනතාවකගේ ජීවන තත්ත්වය නායු වූ වැඩිසටහන් සම්බන්ධීකරණය කරමින්, රෝ අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාදීම උදෙසා ක්‍රියාකරන, ශ්‍රී ලංකා රජය, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් සහ වතු අංශයේ වෘත්තීය සම්මිත්වා සමන්විත තෙතුපාර්ශ්වීක ආයතනයකි.

වතු කමිකරුවන්ගේ යහපත උදෙසා, පිහිටුවා ඇති මෙම ආයතනය, යටිතල පහසුකම් හා සමාජ සංවර්ධන වැඩිසටහන් රසක් මෙහෙයුමේහි ලා අදාළ අමාත්‍යාංශ, වෘත්තීය සම්මිත්, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්, ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා වෙනත් දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික ආයතන සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.

එමෙන්ම, ගරු අමාත්‍යත්වමා විසින් පත්කරනු ලබන සභාපතිවරයෙකු සහ ශ්‍රී ලංකා රජය, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම හා වෘත්තීය සම්මිත් නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් යටතේ වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි ප්‍රධාන කාර්යාලය බත්තරමුල්ල, රෝඛටි ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටා ඇති අතර, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකුගේ මෙහෙයුම් යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ගාල්ල, රත්නපුර, බදුල්ල, කැගල්ල, මහනුවර, හැටන් සහ තුවර්ජිය යන ස්ථානවල පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හතක් මගින් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කටයුතු ගක්තිමත් කෙරේ. ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂකවරයා අදාළ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රධානීය වන අතර, තාක්ෂණික, මූල්‍ය හා කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය ඔහුට සහාය සලසයි.

වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරයේ ප්‍රාදේශීය ව්‍යුහය.

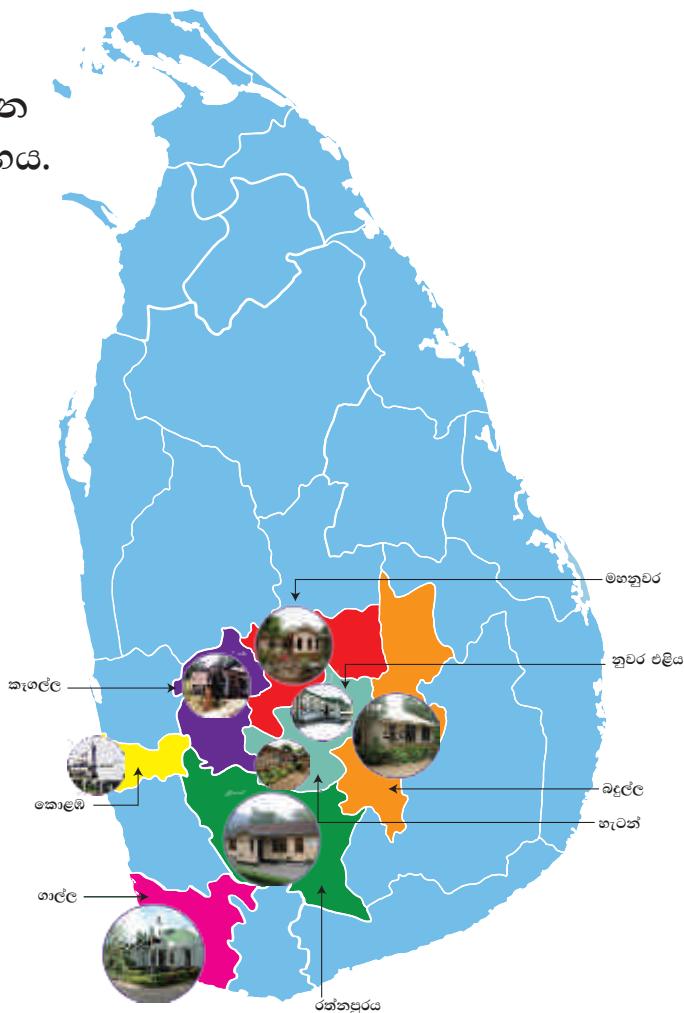

8.1.3. වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හා සම්බන්ධිත ආයතන

වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සම්මිතය

වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සම්මිත, සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුව හා ඒකාබද්ධව 1993 දී පිහිටුවන ලදී. මූලික වගයෙන් නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද මෙම සම්මිත, මේ වනවිට ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් මගින් පාලනය වන වතුයායවල් 435 ක් ආස්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වේ.

දැනට වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සම්මිත 418 ක් දිවයින තුළ (ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් සහ රජය විසින් පාලනය කරනු ලබන සමාගම් සම්බන්ධිතව) පිහිටුවා ඇත. දැඩි අනුග්‍රහයක් පවතින ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වල වතුයායවල් ආස්‍රිතව පිහිටුවා ඇති මෙම සමුපකාර සම්මිත බොහෝමයක්, ප්‍රමුඛ ප්‍රජා මූල සංවිධාන ලෙස රට තුළ සේවාපනය වී ඇත. ඒවා වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල අධික්ෂණය යටතේ නිර්ණායක මත පදනම් වූ ඉහළ ග්‍රෑනීගත කිරීම් වලට ලක් කර ඇති අතර, ඒවායේ නිරන්තර සුපරික්ෂාවට භාජනය වේ.

මෙම සම්මිත, "වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සම්මිත (වනිස) බැංකුව" යන නමින් ඔවුන්ගේම බැංකු හරහා සිය අරමුදල් උපද්‍රවාගනු ලබන අතර, ඔය මුදල් සපයා දීමට ද කටයුතු කරයි.

ණය සැපයීමට අමතරව, රකියා අවස්ථා ද උදා කරමින්, වතුවල පදිංචි නිවැසියන් හට ඔවුන්ගේ සේවා අවශ්‍යතා සඳහා පහසු ප්‍රවේශයක් සලසා දෙමින්, සමුපකාර සම්මිත, සිල්ලර භාණ්ඩ / ගුහසාධන වෙළඳසැල්, බාබර් සැලුන් හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන යනාදී ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කිරීමටද පහසුකම් සලසා ඇත. වතු නිවැසියන්ගේ ජ්‍වන තත්ත්වය, ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය, පෝෂණය, සනිපාරක්ෂාව හා පවතුනාව යනාදීය ඉහළ නැංවීම පිණිස ඔවුනට අවශ්‍ය වන භාණ්ඩ හා සේවා පහසුවෙන් ඔවුන් වෙත ප්‍රාග්‍රැන්ඩ් සඳහා, වතු සේවක නිවාස සමුපකාර සම්මිත තම උප නියෝජිතයන් ලෙස යොදාගනිමින් "වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය", බහු ජාතික සමාගම් සහ වෙනත් ප්‍රමුඛ පොද්ගලික අංශයේ සංවිධාන සමග ද ඒකාබද්ධව කටයුතු කරයි.

51

8.1.4. වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්

8.1.4.1. මෙම අමාත්‍යාංශය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති

• 2017 නව නිවාස

කුදාරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් වතු ප්‍රජාව වෙත නිවාස 2,466 ක් ඉදිකර දීම සඳහා 2017 වසරේ දී රු.මි. 2000 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අතර එම නිවාස ඉදි කිරීම වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා සිදු කෙරේ. 1993 සිට වැවිලි ප්‍රජාව සඳහා නිවාස ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලද විශාලතම ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය මෙය වන අතර 2017 සැප්තෝම්බර් 30 වන විට ඉන් 30% ක (රු. මි. 550) පමණ ප්‍රතිපාදන වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය වෙත ලැබේ ඇත.

ඊට අමතරව "ප්‍රතිලාභී මූලිකත්ව" නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, අමාත්‍යාංශයේ සං්ප්‍රදාය අධික්ෂණය යටතේ වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය විසින් තුවරුවීලිය ප්‍රදේශය හැර ඉතිරි ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ඒ යටතේ නිවාස ඒකක 136 ක් ප්‍රතිලාභීන් විසින් ඉදිකරනු ලබයි.

● ආපදා සහන නිවාස - 2017

අමාත්‍යාංශය විසින් 2017 වසරේ දී ගාල්ල, හැටන්, රත්නපුර, බඳුල්ල හා කැගල්ල යන ප්‍රදේශයන්හි ස්වාධාවික විපත් වලට ලක් විමෙන් වාසස්ථාන අභිම් වූ ප්‍රදේශ සඳහා නිවාස ඒකක 406 ක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත. එම නිවාස ඉදිකිරීම වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

● ජේල් නිවාසයන්හි වහල තැවත සෙවිලි කිරීම

නව නිවාස ඉදිකරන තෙක්, අතරමැදි පියවරක් වශයෙන්, ජේල් නිවාසයන්හි දිරාපත් වූ වහල තැවත සෙවිලි කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර වැවිලි මානව සංවර්ධන හාර ප්‍රදේශ 07 ක් තුළ හඳුනාගත් ජේල් නිවාස ඒකක 452 ක් වහල තැවත සෙවිලි කිරීම සඳහා රු.මි. 26 ක ප්‍රතිපාදන මේ වනවිට අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දී ඇත. එමෙන්ම, අමතර නිවාස ඒකක 872 ක් සඳහා අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

● සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම

වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය මගින් සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘති 489 ක් මෙම වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඒ සඳහා දැනට රු.මි. 29 ක ප්‍රතිපාදන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දී ඇත.

● විශේෂ ව්‍යාපෘති - 2017

මෙට අමතරව, විශේෂ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රු.මි. 225 ට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ඇත. විවිධ ඉදිකිරීම, දැනුවත් කිරීම, පුහුණු වැඩි සටහන් රාකියක් ද එයට ඇතුළත්ය.

● පෝෂණ අතිරේකය

වතු අංශයේ ලමා මන්දපෝෂණය අවම කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුන්වා දුන් පෝෂණ වැඩසටහන "වැවිලි මානව සංවර්ධන හාරය" හරහා ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ දක්වා වැයකර ඇති මුදල රු.මි. 15 කි.

8.1.4.2. අනෙකුත් ආයතනයන්හි ප්‍රතිපාදන මත ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන්

● පුරුව ලමා විය සංවර්ධන වැඩසටහන

ලේඛක බැංකු ආධාර යටතේ කාන්තා හා ලමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා එක්ව පුරුව ලමාවිය සංවර්ධනය සඳහා වන පස් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එහි සමස්ත ආයෝජනය ඇ.ඩො.මි.10 ක් වේ. වැවිලි ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන වයස අවුරුදු 3 - 5 අතර දරු දැරියන්ගේ ලමා සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව වැඩි දියුණු කිරීම මෙහි අරමුණ වන අතර, මෙය වසර 2020 දී නිම් කිරීමට නියමිතය.

මේ යටතේ ගොඩනැගිලි, ක්‍රිඩා පිටි සහ උපකරණ ද සහිතව ඉදි කිරීමට අපේක්ෂිත නව ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 140 ක් වන අතර, දැනටමත් වැවිලි ප්‍රදේශ තුළ ඇති වැඩි දියුණු කිරීමට නියමිත ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 175 කි. එමෙන්ම අවශ්‍ය උපකරණ ද සහිතව නව ක්‍රිඩා පිටි 175 ක් ඉදි වන අතර දැනට ඉදි කර ඇති ක්‍රිඩා පිටි 210 ක් නවීකරණය සිදු කෙරේ. එමෙන්ම ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල ගුරුවරුන්/ සහායකයින් සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුවීම් ලබා දීම ද, දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්ද මෙයට ඇතුළත් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ, 2016 වසර තුළ වැවිලි ප්‍රදේශ හතක් තුළ නව ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 28

ක් ඉදිකිරීමට හා මධ්‍යස්ථාන 35 ක් වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු අරණා ඇති අතර ක්‍රිඩාපිටි 42 ක් ද ඉදිකිරීමට නියමිතය. ලමා සංවර්ධන නිලධාරීන් 206 දෙනෙකු සඳහා ප්‍රාග්ධන වැඩසටහන් පවත්වා ඇත. එමෙන්ම, ප්‍රථම වතාවට ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව පෙර පාසැල් ගුරුවරුන් හා ලමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ සංගණනයක් ද සිදු කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

• ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය හා එක්ව වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය විසින් තුවර්වා සහ හැටන්හි තෝරාගත් ප්‍රදේශවල ගහ ඒකක 15,800 ක් ඉලක්ක කොට ගනීමින් ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතින් 130 ක් ද, ගහ ඒකක 7,300 ක් ඉලක්ක කොට ගනීමින් වැසිකිලිද ඉදි කිරීමට නියමිතය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත පිරිවැය ඇ. ඩො. මි. 14 ක් වන අතර, මෙය වසර 2020 දී නිම කිරීමට නියමිතය.

2017 වසරේදී ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතින් 12 ක් ආරම්භ කර ඇති අතර ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී. ආරම්භ කර ඇති වැසිකිලි ව්‍යාපෘති 2,292 කින්, 270 ක් අවසන් කර ඇති අතර ඉතිරි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.



8.2. ප්‍රජාගක්ති මෙහෙයුම් ඒකකය

ප්‍රජා ගක්ති මෙහෙයුම් ඒකකය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ හැටන් පුල්බැන්ක් හි පිහිටි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, රම්බොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, නොර්වුඩ හි පිහිටි ක්‍රිඩා සංකීර්ණය හා ප්‍රජාගක්ති මධ්‍යස්ථානයන්, 2016.07.02 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් අමාත්‍යාංශයේ සංඝ්‍ර අධික්ෂණය යටතට පවරාගනු ලැබේ.

ඒ අනුව කොල්ලුපිටිය සාන්ත මයිකල් පාර අංක 45, දරන ස්ථානයෙහි පිහිටා ඇති මෙම අමාත්‍යාංශ පරිගුයෙහි ප්‍රජාගක්ති මෙහෙයුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටුවා ඇති අතර, එමගින් අමාත්‍යාංශයේ සංඝ්‍ර අධික්ෂණය මත, ඉහත ආයතන 4 හි ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

8.2.1. ප්‍රජාගක්ති (E- KIOSK) සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාලුල ලෙස හාවිතා කරමින් අඩු වරප්‍රසාද ලත් ජන කොටස් වෙත පුරුණවුන්, විස්තිරණවුන් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයක් නිමිකරදීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අනිලාපය වේ. වතු ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් ප්‍රජාගක්ති මධ්‍යස්ථාන 44 ක් හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

ග්‍රාමීය හා වතු ප්‍රදේශයන්හි පළමු වසරේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ඕළු - ඕළුවාවන්ටද පාසල් හැර හිය තරුණ - තරුණීයන්ටද පරිස්‍යක අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ කේත්දස්ථානය වශයෙන් ප්‍රජාගක්ති මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියා කරනු ලබයි. එසේම අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් අවශ්‍ය වන්නන් සඳහා නොමිලේ එම පහසුකම් ලබා දීමටද, පුස්තකාල පහසුකම් සැපයීම තුළින් ඔවුන්ගේ කියවීම හා දැනුම වර්ධනයටද, කිවි නාට්‍ය හා ක්‍රිඩා තරග ක්‍රියාත්මක පොරුෂන්ව සංවර්ධනයටද මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා පහසුකම් සලසා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වියකියාව හා උග්‍ර රැකියා නියුක්තියේ ඉහළම අය වැවිලි ප්‍රදේශ වැළින් පෙන්නුම් කෙරෙන අතර, මෙම තන්ත්වය මග හැරවීම පිණිස, වැවිලි ප්‍රදේශ ඉලක්ක කොට ගනිමින් අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන මත, තරුණීයන් බලගැනීවීම සඳහා විශේෂ වැඩිසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර, එමගින් රැකියා වෙළඳපාලට ප්‍රවේශ වීම සඳහාත්, ස්වයං රැකියා අවස්ථා බිහිකරලීමටන් අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.

2017 - විශේෂ ව්‍යාපෘති - කාන්තාවන් බල ගැන්වීම - පුහුණු වැඩිසටහන

සමාජ, ආර්ථික හා දේශපාලනික සන්දර්භයන් තුළ වැවිලි කාන්තාවන්ගේ තියෙකුරනය ඉහළ තැබීම සඳහා කාන්තාවන් බලාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත ප්‍රජා ගක්ති මධ්‍යස්ථාන හරහා විශේෂීත වැඩිසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර එමගින් කාන්තා සංවිධාන ගක්තිමත් කරමින් නව ආදායම උත්පාදන මාර්ග ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයීම ද සිදු කෙරේ. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් 500 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් වැඩිසටහන් 14 ක් මේ වන විට පවත්වා ඇති අතර ඉදිරියේදී තවත් වැඩිසටහන් රාජියක් ද පැවැත්වීමට නියමිතය.

8.2.2. වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - පුල් බැන්ක්, හැටන්

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලැබූ මෙම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2007 වසරේදී සෞමුෂ්‍රිත තොණ්ඩමාන් අනුස්මරණ පදනම යටතටත්, අනතුරුව 2016 වසරේදී මෙම අමාත්‍යාංශයේ සංඝ්‍ර අධික්ෂණයටත් පත් කරන ලදී.

ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ වෘත්තීය පුහුණු විශේෂය උපදේශකවරුන් 07 දෙනෙකුගේ සේවය මෙම ආයතනය වෙත ලැබූන අතර 2017 වසරේ සැප්ත්මැබර් මස වනවිට කොන්ත්‍රාත් කාලය සම්පූර්ණ වීම

හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ සේවය අවසන් වී ඇත. මේ වන විට වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හරහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 12 ක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන අමාත්‍යාංශය මගින් සපයනු ලබයි.

මිට අමතරව අ.පො.ස. (උ/පෙළ) ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විෂයය හඳුරන සිසුන් සඳහා දේමල මාධ්‍යයෙන් අමතර පන්ති පැවැත්වීමක් සිදු කරන අතර, ඒ සඳහා බදුල්ල, මාතලේ, කොටගල හා ප්‍රසැල්ලාව වැනි විවිධ ප්‍රදේශ වලින් සිසුන් සහනාගි වේ.

ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ පූල් බැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු මහ කොමිෂන් කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝගතනය කරමින් මෙම අමාත්‍යාංශය 2017.09.20 දින අවබෝධනා ගිවිසුමකට එළඟී අතර, ඉන්දියානු රජයේ ආධාර යටතේ රු. මිලයන 199 ක් වැය කර එහි ගොඩනැගිලි නවීකරණයක්, වාහන යන්ත්‍රෝපකරණ හා අදාළ අනෙකුත් උපාංග මිලදී ගැනීමටත් නියමිතය.

වසරකට සිසුන් 400 ක් පුහුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් මෙම ස්ථානය සතුව ඇති අතර 2017 වසර තුළදී පාඨමාලා 12 ක් යටතේ සිසුන් 335 ක් ලියා පදිංචි වී ඇත. එහිදී මෝටර් කාර්මික පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ලද සිසුන් විසින් මෝටර් රෝක්ස් එකලාග (Essembling) කිරීම සුවිශේෂීත ජයග්‍රහණයක් ලෙසට හැඳින්විය හැක.

වගව15 : 2017 වසරේ පූල් බැන්ක් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය යටතේ විවිධ පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි වීම පිළිබඳ විස්තර

ක්‍රියාව	පාඨමාලාව	ලියාපදිංචිය								
		මාරු - දෙසැම්බර 2017			මාරු - ජූනි 2017			ඡූලි - දෙසැම්බර 2017		
		පි	ගැ	ඡ	පි	ගැ	ඡ	පි	ගැ	ඡ
1	මෝටර් කාර්මික	20	-	20	-	-	-	-	-	-
2	විදුලි කාර්මික	20	-	20	-	-	-	-	-	-
3	කාර්මික ඕල්පී	14	-	14	-	-	-	-	-	-
4	ගුවන් විදුලි රුපවාහිනී අලුත්වැඩියාව	7	1	8	-	-	-	-	-	-
5	අැප්‍රේලීනියම් ගැබරිකේටර්	-	-	-	15	-	15	18	-	18
6	අදුම් මැසිම්	-	-	-	-	29	29	-	26	26
7	ගැහස්පි විදුලි කාර්මික	-	-	-	6	4	10	10	2	12
8	හෝටල් කළමනාකරණය	-	-	-	12	12	24	11	4	15
9	තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණය	-	-	-	13	13	26	5	14	19
10	මෝටර් සයිකල් කාර්මික	-	-	-	20	-	20	17	-	17
11	පැස්සුම් ඕල්පය	-	-	-	13	-	13	11	-	11
12	ව්‍යුත් කාර්මික	-	-	-	11	-	11	7	-	7
	එකතුව	61	1	62	90	58	148	79	46	125

8.2.3. රම්බොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අඩු පහසුකම් සහිත ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතික අනිමතාරථයන් හා පිළිවෙත් වර්ධනය කිරීමේ අදහසින් මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා ඇත. 2009 වසරදී සිට කරනාටක සාගිනය, විනා වාදනය, තබාලා හා වයලීන් වාදනය පිළිබඳව ආවාර්යවරයකුගේ පූර්ණ කාලීන අධික්ෂණය යටතේ පාඨමාලා පැවැත්වේ. පුහුණු වැඩසටහන් දියත් කිරීම සඳහා මෙම මධ්‍යස්ථානය විශ්වවිද්‍යාලයක් හා ඒකාබද්ද කිරීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ගනිමින් පවතී. අමතර ආදායම් මාරු ලෙස, උත්සව පැවැත්වීමට හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් සැපයීමද මෙමගින් සිදු කෙරේ.

8.2.4. නොරුව්හි පිහිටි ක්‍රිඩා සංකීරණය - නොරුව්හි

මෙම අමාත්‍යාංශයේ සංස්ථා පාලනය යටතේ මෙම ආයතනය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය මගින් 2011 වසරේදී රු. ම්. 25 ක මුදලක් වැය කර ක්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය කර ඇත.

අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ 2017 වසරේදී දී එහි ඇතැම් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකර ඇති අතර, අවට පාසල් හා රාජ්‍ය ආයතන රාඛියක් විවිධ ක්‍රිඩා තරග හා ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම සඳහා මෙම ක්‍රිඩා සංකීරණය යොදා ගනු ලැබේ.



09

අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂා හා 2018 ආයෝජනය

වැවිලි ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා සකස් කරන ලද පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි ඉලක්ක කොට ඇති දැරුණු සපුරා ගැනීමේ අඩිප්‍රායෝන් අමාත්‍යාංශයේ 2018 අයවැය ඇස්සේමෙහින්තුව සකස් කර ඇති අතර ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පාර්ශ්වකාර අමාත්‍යාංශ, ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් එම ආයතනයන්ද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දක්වා ඇති ඉලක්ක වෙත ප්‍රාග්ධනය ඇති අමාත්‍යාංශය දැඩි ප්‍රයත්තයක් දරමින් සිටී.

නායාම් වලට වැඩි අවදානමක් පවතින ප්‍රදේශවල පිටත් වන වැවිලි ප්‍රජාව වෙත විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි (2016 - 2020) අපේක්ෂා කරනු ලබන නිවාස ඒකක 56,500ක ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා 2018 වසර තුළදී නව නිවාස ඒකක 7,000 ක් පමණ ඉදිකිරීමටත් 2017 අව්‍යාපිත්ත වන නිවාසයන්හි වැඩ කටයුතු මූල්‍යන්ම නිම කිරීමටත් අපේක්ෂ කරන අතර එකී නිවාස යෝජනා ක්‍රම සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය, ජලය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමටත් හඳුනාගත් පසුගාමී ප්‍රදේශයන්හි ජල, විදුලි හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩ දියුණු කිරීමටත් ක්‍රියාකරනු ලැබේ.

රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල යටතේ ඉදිකරන නිවාස ප්‍රමාණයට අමතරව, ඉන්දියානු ආධාර යටතේ නව නිවාස 10,000 ක් ලබා දීම සඳහා ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පසුගිය ශ්‍රී ලංකා සංවාරයේදී එකතාවය ලැබේ ඇතේ.

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් හඳුනාගත් ව්‍යාපාති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රමානවත් ප්‍රතිපාදන නොමැති බැවින් අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීමට අමාත්‍යාංශය විදේශ සමුළුවක් පැවැත්වීමට (Donor forum) කටයුතු යොදා ඇති අතර පාර්ශ්වකාර ආයතන විසින් සිය ව්‍යාපාති සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට එය අවස්ථාවක් කර ගනු ඇතේ.

කොන්ත්‍රාත් මූලික ඉදිකිරීම් ක්‍රමයෙහි පවතින අඩුපාඩු අවම කොට ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා නව සංක්ලේෂණයන් වෙත අවධානයන් යොමු කර ඇති අතර එය යටතේ ප්‍රතිලාභී මූලිකත්ව, රාජ්‍ය පෙළුද්ගලික හැඳුවකාරීත්වය, පෙර සවී ආකාති නිවාස (Precast / Panel) යනාදිය හඳුන්වා දී ඇතේ. එහි සංර්ථකත්වය අනුව 2018 දී එම ක්‍රමයන් තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂිතය.

වැවිලි ප්‍රජාවගේ පිටත්වාය හා පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන මත්පැන් හාවිතය අවම කිරීම, ව්‍යුතු රෝග නිවාරණය, පෝෂණ වැඩමුළු හා පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් 2018 දී ද අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන අතර 2017 වසරේ ඇරඹි දිලිඳුකම දුරලිමේ වැඩසටහනද ජ්‍රේ අයත්ය.

වතු දරුවන්ගේ මන්දපෝෂණය වැළැක්වීමට වයස අවුරුදු 3 - 5 අතර දරුවන් සඳහා පෝෂණ අනිරේකයක් ලබා දීම නියමු ව්‍යාපාතියක් ලෙසට මෙම වසරේදී ආරම්භ කළ අතර එය 2018 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ප්‍රගතිය මත අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

නුපුහුනු ගුම්කයන්ගේ සංක්ෂුජය වැළැක්වීමට හා රැකියා වෙළඳපාල ඉල්ලුමට සරිලන ගුම්කයන් බිඟ කිරීම අරමුණු කොට හැටන්හි පිහිටි පූල් බැන්ක් වැන්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය නවිකරණය කෙරෙන අතර රේට අවශ්‍ය නව තාක්ෂණය ලබා දීමත්, නව පායමාලා හඳුන්වා දීමත්, අනෙකුත් පහසුකම් ලබා දීමත් ඉන්දියානු රජයේ ආධාර මත සිදු කෙරේ.

වැවිලි ප්‍රජාවගේ ඉඩම් හිමිකම සනාත කරමින් “නිරවුල් ඔප්පු ප්‍රදානය” 2018 වර්ෂයේදී ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත අතර නිරවුල් ඔප්පු 6,624 ක් නිවාසලායින්ට ලබා දීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මේ වන විට ලැබේ ඇතේ.

වැවිලි ප්‍රජාවගේ සමාජ සංවර්ධන ඉලක්ක අත් පත් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන අඩියෝගයක්ව පවතින සමාජ ආර්ථික දත්ත හා තොරතුරු නිග කම හේතුවෙන් ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දක්වා ඇති පරිදි හු විද්‍යාත්මක තොරතුරු ආක්‍රිත සිනියම් පද්ධතියක්ද සමඟ දත්ත පද්ධතියක් 2018 වර්ෂයේදී සකස් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇතේ.

10

අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන කියාකාරකම්







වැට්ලි ප්‍රජාව මෙතක් මුහුණ දුන් සමාජ විෂමතාවන් තුරන්කොට, ඔවුන් අහිමානවක් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් ලෙස පරිණාමනය කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කළ කුදාරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, වැට්ලි පුදේශ කේන්දුගත කර ගනිමින් ජිවත්වන මිලයනයකට අධික වැට්ලි ප්‍රජාවගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය නිසි දිගානතියක් ඔස්සේ මනා අධික්ෂණයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවත්තිරූප වී ඇත.

බෙරුන්තොට් මක්කள් නිතුවරු මුකම්කොටුත්තු බවත් සමුක්‍රමයෙන් ප්‍රාග්ධනය න්‍යායීය ප්‍රජාවක් නීක්කී අවර්කණ කෙளාර්යමාන කිරාමිය සමුකමාක පරිනිමිකක් සෙයෝම් තොක්කුතැන් මලෙලනාටු ප්‍රතිය කිරාමංකක් උට්කට්ටමය්පු මත්‍රුම සම්තාය අපිවිරුත්ති අමෙස්ස බෙරුන්තොට් පකුතිකණ මෙයාමාකක කොண්ටු බාඩ්න්තු බරුකින්‍ය ඉග්‍ර මිල්ලියනුක්කුම මෙෂ්පට් මක්කණතු සමුක්, පොරුණාතාරා අපිවිරුත්තියෙ මුරෙයාන තිශේමුකප්පැන්ත්‍රාලින් නොකළවුම සිර්න්ත මෙෂ්පාර්ශවයුතුවුම මෙෂ්කොණුවුම පොරුටු ආරම්පිකකප්පාලනතු.

The Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development was established with the intention of transforming the plantation community with dignity, by removing the social disparities they face, into a village community, giving proper direction for implementation & focusing on upliftment of the socio economic status of over one million population living in plantation areas.



කුදාරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
මලෙලනාටු ප්‍රතිය කිරාමංකක්, උට්කට්ටමය්පු මත්‍රුම සමුක් අපිවිරුත්ති අමෙස්ස
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development
